ROUTING SLIP

No Dok	: PSBSF:PKPP:04:004
No Rev	: 7
Halaman	: 1 dari 1

Subkontraktor : PT. Andalan Artha Primanusa
SPPH : SPPH 05852
Periode : Juni 2026
Tagihan ke : 12 dari 36

NO	Alur Proses	Tanggal		Keterangan	Paraf
		Datang	Selesai		
1	Rekonsil data HM unit rental dan/ atau volume produksi antara Pihak Sub-Kontraktor dan Section Subkontraktor (Departemen PKPP) PT SBS	05/07/26	05/07/26	ok.	
2	Penyerahan Berita Acara Produksi & *Coal Getting* dan/ atau Berita Acara Jam Jalan Unit Rental oleh Pihak Sub-kontraktor	08/07/26	08/07/26	ok.	
3	Validasi Berita Acara Produksi & Coal Getting dan/ atau Berita Acara Jam Jalan Unit Rental oleh Departemen PKPP	09/07/26	13/07/26	REVISI OK	
4	Pemeriksaan dan Persetujuan BA oleh Manajer Pengelola Kinerja Produksi & Project	23/07/26	23/07/26	Ada coba kembali	
5	Pemeriksaan dan Persetujuan BA oleh Manajer Produksi / Manajer Layanan Penunjang Tambang	28/7-26	28/7-26	ok -	
6	Pemeriksaan dan Persetujuan BA oleh Senior Manajer Produksi				
7	Penyerahan kelengkapan dokumen pendukung Verifikasi Tagihan oleh Sub-Kontraktor .				
	a. Laporan Bulanan				
	b. Laporan BPA				
	c. Rencana Kerja / BA Joint Survey / Foto HM	15/07/26	16/07/26		
	d. Berita Acara Penggunaan BBM	09/07/26	14/07/26		
8	Pemeriksaan dan Persetujuan lembar Verifikasi Tagihan oleh Manajer Pengelola Kinerja Produksi & Project	27/07/26	27/07/26	ok.	
9	Pemeriksaan dan Persetujuan lembar Verifikasi Tagihan oleh Senior Manajer Produksi	28/07/26	28/07/26	ok proses.	
10	Pemeriksaan dan Persetujuan lembar Verifikasi Tagihan oleh Project Manajer	28/07/26	28/07/26		
11	Persetujuan Lembar Verifikasi Tagihan oleh Direktur Operasional Produksi				
12	Pengambilan Dokumen pendukung invoice oleh Pihak Sub-Kontraktor				

Dipindai dengan CamScanner

Project: 0626 Lumpur Embungan 6 PitE
User: SURVEY
Organization: JOINT SURVEY PTSBS & PTBA
Date: Sat Jul 04 13:47:32 2026
Report File: Volume Lumpur Embungan Pite sd 30 JUNI 26.rpt


---------- BEGIN STRING TIN-TIN VOLUME REPORT ----------

Surface to surface volume down a string report - (with plan polygon "0126 BO LUMPUR sd 30 JUNI 26->")

reference string BASELINE LUMPUR->
original tin 001 Top lumpur embungan 20 nov 25 all
new tin 001 Base lumpur embungan 20 nov 25 all
extrapolated no
separation 10.000
method Prismoidal - 2 sections

cut volumes and areas are negative
fill volumes and areas are positive

distance-	-sectional information-				intermediate information		-accumulative information--			
			---cut area	--fill area	----cut vol	---fill vol	------cut vol		-----fill vol	

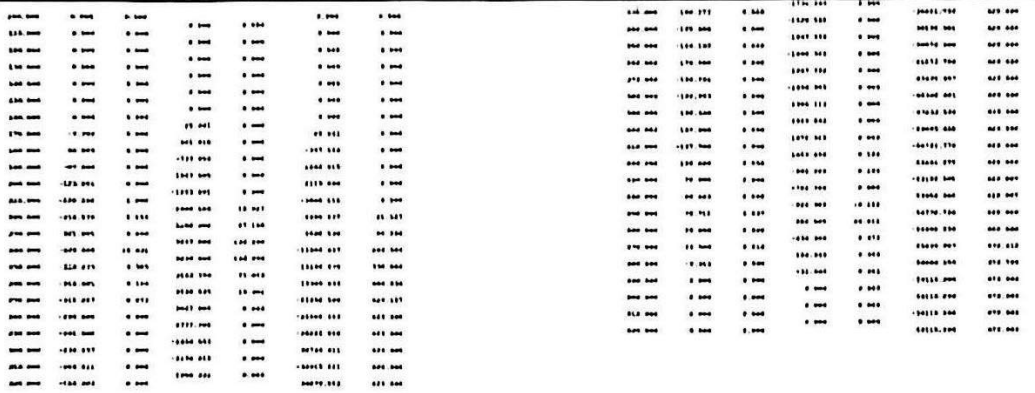

total plan area	43713.950
total cut	-56115.296
total fill	472.969
balance	-55642.326
ie excess of cut over fill	55642.326

---------- END STRING TIN-TIN VOLUME REPORT ----------

Note :
Galian lumpur Embung Selatan (VI) Pit E periode Juni 2026(JOINT SURVEY)

Volume galian lumpur sd periode Juni 2026	:	55,642.326 Bcm
Volume galian lumpur sd periode Mei 2026	:	54,487.575 Bcm(-)
Total Volume galian lumpur periode Juni 2026	:	1,154.751 Bcm

PIHAK PERTAMA
PT. Satria Bahana Sarana
Data Survey Officer

M. DELLI MAULANA

PIHAK KEDUA
PT. Andalan Artha Primanusa
Data Survey Officer

Adhe Wahyu Alsandi

Dipindai dengan CamScanner

SBS Mining Solution	VERIFIKASI PEKERJAAN JASA PERAWATAN TAMBANG PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA (SPPH - 05852) ADD II BULAN JUNI 2026	No. Dokumen : PSBSF:PKP:04:001 No. Revisi : 6 Halaman : 1 dari 1

Rencana Volume Tanah	=	233,530	Bcm	ACH (%)
Rencana Jarak	=	2,804	Meter	109.3%
Aktual Volume Tanah	=	255,138.65	Bcm	
Aktual Jarak	=	2,284	Meter	
Pengunaan BBM tanah	=	203,734	Liter	
Rencana Fuel Ratio tanah	=	0.63	Liter/bcm	
Aktual Fuel Ratio tanah	=	0.72	Liter/bcm	

Lokasi		Material	Vol. Truckcount (bcm)	Vol. Joint Survey (bcm) (a)	Jarak (Meter)	Tarif	Tagihan (c = a x b)
Loading	Dumping						
PIT E SBS	DISPOSAL SEKATAN	CLAY	82,608.00	80,114.79	3,040	Rp 22,654	Rp 1,814,920,452.66
PIT E SBS	RENCANA JALAN	CLAY	24,450.00	23,741.16	1,320	Rp 12,638	Rp 300,040,780.08
PIT E SBS	RENCANA CSA	CLAY	456.00	442.24	700	Rp 8,346	Rp 3,690,935.04
PIT E SBS	JALAN BARITO	CLAY	34,776.00	33,726.42	1,995	Rp 15,500	Rp 522,759,510.00
PIT E SBS	SEKATAN	CLAY	114,024.00	110,582.62	2,089	Rp 16,931	Rp 1,872,274,339.22
PIT E SBS	TS MAHONI	CLAY	1,584.00	1,536.19	3,018	Rp 22,654	Rp 34,800,848.26
PIT E SBS	IPD WATERFILL	CLAY	3,960.00	3,840.48	605	Rp 8,346	Rp 32,052,646.08
			261,888.00	253,983.90	2,285		Rp 4,580,539,511.34

Lokasi		Material	Vol. Truckcount (bcm)	Vol. Joint Survey (bcm) (a)	Jarak (Meter)	Tarif	Tagihan (c = a x b)
Loading	Dumping						
PIT E SBS	SEKATAN	LUMPUR	1,166.40	1,154.75	1,907	Rp 19,375	Rp 22,373,281.25
			1,166.40	1,154.75	1,907		Rp 22,373,281.25

UNIT	JAM JALAN MINIMUM	JAM YANG DIBAYARKAN	JAM OPERASI	JAM COALGETTING	JAM GENERALOB	UNIT PENGGANTI	JAM PT AAP	JAM TERSEDIA	JAM BD	JAM STANBY	Availibility (%) PLAN (MA)	AKTUAL (MA)	PLAN (PA)	AKTUAL (PA)	Fuel Consmp. Plan (Ltr/Jam)	Fuel (Ltr)	Fuel Consmp. Actual (Ltr/Jam)
BULLDOZER CAT D10T (BDCT1001)	250	250.7	262.8	0.0	250.7	0.0	12.1	630.0	258.2	109.0	85.0%	50.4%	90.0%	59.0%	80.82	20,683	78.70
BULLDOZER CAT D10T (BDCT1002)	250	298.4	308.7	0.0	298.4	0.0	10.3	630.0	91.8	229.5	85.0%	77.1%	90.0%	85.4%	80.82	22,646	73.36
EXCAVATOR CAT 395 (EXCT3091)	250	386.3	434.6	0.0	386.3	0.0	48.3	630.0	48.9	146.5	85.0%	89.9%	90.0%	92.2%	76.88	27,161	62.50
EXCAVATOR CAT 395 (EXCT3092)	250	400.6	465.4	0.0	400.6	0.0	64.8	630.0	29.6	135.0	85.0%	94.0%	90.0%	95.3%	76.88	27,345	58.76
TOTAL	1,000.0	1,336.0	1,471.5	0.0	1,336.0	0.0	135.5	2,520.0	428.5	620.0						97,835	

	Tarif per Jam Unit Utama	Tarif per Jam Unit Pengganti	Tagihan Unit Utama	Tagihan Unit Pengganti	Total Tagihan
BULLDOZER CAT D10T (BDCT1001)	Rp 1,980,000	Rp -	Rp 496,386,000	Rp -	Rp 496,386,000.00
BULLDOZER CAT D10T (BDCT1002)	Rp 1,980,000	Rp -	Rp 590,832,000	Rp -	Rp 590,832,000.00
EXCAVATOR CAT 395 (EXCT3091)	Rp 1,425,000	Rp -	Rp 550,477,500	Rp -	Rp 550,477,500.0
EXCAVATOR CAT 395 (EXCT3092)	Rp 1,425,000	Rp -	Rp 570,555,000	Rp -	Rp 570,555,000.0
					Rp 2,208,550,500

Grand Total	**Rp**	**6,811,463,293**
PPN (11%)	Rp	749,260,962
Denda Ketidaktercapaian MA (A)	Rp	191,073,864
Kelebihan Pemakaian BBM Hauler (B)	Rp	520,428,670
Denda Ketidaktercapaian Volume April 2025 - Juni 2026 (C)	Rp	60,674,936
(Grand Total + PPN (11%))-(A+B+C)	**Rp**	**6,788,546,836**

Note :

1. Berita acara denda ketidaktercapaian MA terlampir

2. Berita acara kelebihan pemakaian BBM Hauler terlampir

3. Berita acara Ketidaktercapaian Volume April 2026 - Juni 2026 terlampir

Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Oldev Adhitya Anugra	Taufik Tohi	Xaverius Ferry Tharob	Adhi Gunawan
Manajer PKPP	Senior Manajer Produksi	Project Manajer	Plt. Direktur Operasi Produksi

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA KELEBIHAN PEMAKAIAN BBM
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
PERIODE : JUNI 2026
Nomor : 915 /SBS-Banko/PM/VII/2026

Pada hari tanggal 29 bulan 07 tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Tanjung Enim, dibuat Berita Acara Kelebihan Pemakaian BBM Unit Perjanjian **Paket SPPH 05852** antara :

1. **PT. SATRIA BAHANA SARANA**, selaku pemberi tugas yang diwakili oleh Project Manager selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

dan

2. **PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA** selaku pelaksana tugas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kontrak **SPPH 05852** Addendum II Pasal 12 yang berbunyi :

> 14. Penggunaan BBM yang melebihi Batasan *Fuel Ratio (FR)* atau *Fuel Consumption (FC)* yang disepakati akan menjadi beban PIHAK KEDUA dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai potongan biaya terhadap tagihan PIHAK KEDUA pada bulan berjalan.

Berikut perhitungan Kelebihan Penggunaan BBM Unit HD Berdasarkan *Fuel Ratio (FR)* Per Jarak Angkut :

Kelebihan Pemakaian BBM Periode JUNI 2026									
Volume Overburden	Jarak (Meter)	Total Volume BBM (Liter)	Fuel Ratio Aktual	Plan Fuel Ratio	Plan Volume BBM (Liter)	Kelebihan Volume BBM (Liter)	Harga BBM (PerBulan)	Denda Kelebihan BBM	Keterangan
283,669.34	2,284	203,734.00	0.72	0.63	178,711.68	25,022.32	Rp20,798.58	Rp520,428,669.71	Lebih dari Plan FR

Note : Volume aktual OB : 253,964 + (MUD : 1,154.75 x 125% = 14,443) + volume Justifikasi 28,242 = 283,669.34

Rincian Volume Justifikasi (Terlampir)

Berdasarkan hasil perhitungan Penggunaan BBM Unit HD dan *Fuel Ratio (FR)* Per Jarak Angkut diatas maka didapatkan volume biaya BBM yang dibayarkan sebesar ***Rp.520.428.669,71*** Demikian berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA **PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA**	**PIHAK PERTAMA** **PT. SATRIA BAHANA SARANA**
JONARISTON PASARIBU **PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL**	**XAVERIUS FERRY THAROB** **PROJECT MANAGER**

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
DENDA KETIDAKTERCAPAIAN MA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
PERIODE : JUNI 2026
Nomor : 916 /SBS-Banko/PM/VII /2026

Pada hari tanggal 28 bulan 07 tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Tanjung Enim dibuat Berita Acara Denda Ketidaktercapaian MA Alat Berat Perjanjian **Paket SPPH – 05852** antara :

1. **PT. SATRIA BAHANA SARANA**, selaku pemberi tugas yang diwakili oleh Project Manajer selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

dan

2. **PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA** selaku pelaksana tugas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dikarenakan Unit PT Andalan Artha Primanusa mengalami ketercapaian MA dibawah **85%** sesuai perjanjian SPPH – 05852 Pihak Kedua dikenakan denda berdasarkan pada kontrak antara PT SBS dan PT AAP tentang Pasal 8 Ayat 2 yang akan dipotongkan pada tagihan invoice PT AAP dengan perhitungan denda sebagai berikut.

Jun-26

DENDA KETIDAKTERCAPAIAN MA

Denda pelaksanaan pekerjaan alat berat.

a) Bila realisasi pencapaian MA (Mechanical Availability) kurang dari 85%, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda dengan formula perhitungan sebagai berikut:

(MA Rencana – MA Realisasi) x Total Jam Halangan x Tarif Pekerjaan (Rp/Jam) tidak termasuk PPN

Perhitungan MA yang dipergunakan adalah dengan menggunakan rumus:

$$MA = \frac{W}{W + R} \times 100\ \%$$

Keterangan
MA= *Mechanical Availability* realisasi;
W= Waktu Kerja Efektif (jam jalan realisasi termasuk alat pengganti);
R= Waktu Rawatan (termasuk tidak ada operator)

Unit	MA RENCANA	MA REALISASI	Jam halangan	Tarif per jam	Denda MA
BULLDOZER CAT D10T (BDCT1001)	85.0%	50.4%	258.2	Rp 1,980,000	Rp 176,675,704
BULLDOZER CAT D10T (BDCT1002)	85.0%	77.1%	91.8	Rp 1,980,000	Rp 14,398,160
				Total Denda MA	Rp 191,073,864

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

JONARISTON PASARIBU
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

XAVERIUS FERRY THAROB
PROJECT MANAGER

PT SATRIA BAHANA SARANA
Mining Solution
Tanjung Enim
Jl. Jurang Parigi No. 5 Tanjung Enim
Muara Enim - Sumatera Selatan 31716
Tlp.+62734 453035 Fax. +6234 453039

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
DENDA PELAKSANAAN ANGKUTAN MATERIAL
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
PERIODE : APRIL 2026 - JUNI 2026
Nomor : 917 /SBS-Banko/PM/VII /2026

Pada hari tanggal 28 bulan 07 tahun Dua Ribu Dua Puluh enam di Tanjung Enim dibuat Berita Acara Denda Pelaksanaan Angkutan Material Perjanjian **Paket SPPH 05852** antara :

1. **PT. SATRIA BAHANA SARANA** selaku pemberi tugas yang diwakili oleh Project Manajer selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

   dan

2. **PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA** selaku pelaksana tugas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dikarenakan pencapaian volume PT AAP kurang dari 90% Pihak Kedua dikenakan denda berdasarkan pada kontrak antara PT SBS dan PT AAP tentang Pasal 8 Ayat 4 yang akan dipotongkan pada tagihan invoice PT AAP dengan perhitungan denda sebagai berikut.

Denda Ketidaktercapaian volume Triwulan II 2026

Periode	Rencana (BCM)	Volume Aktual (BCM)	Presentase Ketercapaian	Aktual Jarak Angkut	Tarif Berlaku	
b	c	d	e=(d/c)*100%	f	g	
April	184,207	114,028	61.9%	1557	Rp	14,069.00
Mei	207,438	125,598	60.5%	1975	Rp	15,500.00
Juni	233,530	255,427	109.4%	2284	Rp	18,362.00
Total	**625,175**	**495,053**	**79.2%**	**2038**	**Rp**	**16,647.07**

Jarak angkut (Meter)	Tarif Angkut	Rencana Tiga bulanan (BCM)	90% thd rencana Tiga Bulanan (BCM)	Realisasi Tanah (BCM)	Selisih Volume (BCM)	5% Sisa Volume (BCM)	Jumlah (Rp)
a	b	c	d = 90% x c	e	f = d - e	g = 5% x f	h = g x b
2,038	16,647.07	625,175.00	562,658	495,053.103	67,604	3,380.22	56,270,745

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA	**PT. SATRIA BAHANA SARANA**
ANDALAN	
JONARISTON PASARIBU	**XAVERIUS FERRY THAROB**
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL	**PROJECT MANAGER**

PT SATRIA BAHANA SARANA
Mining Solution
Tanjung Enim
Jl. Jurang Parigi No. 5 Tanjung Enim
Muara Enim - Sumatera Selatan 31716
Tlp.+62734 453035 Fax. +6234 453039

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

BERITA ACARA JAM JALAN UNIT ALAT BERAT

TYPE : Bulldozer Catepillar D10T (BDCT1001)
NOMOR :510/SBS-Banko/PRO/VII/2026
PERIODE : 01 - 30 Juni 2026

Pada hari ini , Tanggal 29 Bulan Juli Tahun 2026 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Alat Berat dan SK Penunjukan Pelaksanaan Jasa sewa Alat Berat Kontrak SPPH 05852, maka dibuat Berita Acara Jam Jalan Alat Berat Rental Pengoperasian berdasarkan Service Hour Meter (SHM) periode 01 - 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SHM		JUMLAH JAM OPERASI	PEMAKAI			KETERANGAN
					PT SBS		PT AAP	
		AWAL	AKHIR		Coal Getting	General OB		
1	1-Jun-26	5876.8	5888.7	11.9	0.0	11.7	0.2	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
2	2-Jun-26	5888.7	5900.9	12.2	0.0	12.1	0.1	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
3	3-Jun-26	5900.9	5917.0	16.1	0.0	16.1	0.0	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
4	4-Jun-26	5917.0	5928.1	11.1	0.0	11.0	0.1	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
5	5-Jun-26	5928.1	5942.4	14.3	0.0	14.1	0.2	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
6	6-Jun-26	5942.4	5952.7	10.3	0.0	9.4	0.9	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
7	7-Jun-26	5952.7	5969.6	16.9	0.0	16.8	0.1	SUPPORT DOZING DISPOSAL OB
8	8-Jun-26	5969.6	5969.6	0.0	0.0	0.0	0.0	BREAKDOWN TRACK
9	9-Jun-26	5969.6	5969.6	0.0	0.0	0.0	0.0	BREAKDOWN, TRACK LINK
10	10-Jun-26	5969.6	5979.4	9.8	0.0	8.2	1.6	SUPPORT DOZING DISPOSAL OB SEKATAN
11	11-Jun-26	5979.4	5991.2	11.8	0.0	11.7	0.1	SUPPORT DOZZING OB
12	12-Jun-26	5991.2	6001.6	10.4	0.0	9.9	0.5	SUPPORT DOZING DISPOSAL OB SEKATAN
13	13-Jun-26	6001.6	6003.2	1.6	0.0	1.6	0.0	SUPPORT DOZING DISPOSAL OB SEKATAN
14	14-Jun-26	6003.2	6003.2	0.0	0.0	0.0	0.0	DIBREAKDOWKAN OLEH SBS, TIDAK MAMPU MERIPPING
15	15-Jun-26	6003.2	6003.5	0.3	0.0	0.3	0.0	Breakdown tracklink
16	16-Jun-26	6003.5	6003.7	0.2	0.0	0.2	0.0	BREAKDOWN TRACK
17	17-Jun-26	6003.7	6003.7	0.0	0.0	-0.2	0.2	BREAKDOWN, TRACK
18	18-Jun-26	6003.7	6003.7	0.0	0.0	0.0	0.0	BREAKDOWN TRACK
19	19-Jun-26	6003.7	6003.7	0.0	0.0	0.0	0.0	BREAKDOWN TRACK LINK
20	20-Jun-26	6003.7	6017.8	14.1	0.0	7.5	6.6	BD TRACK LINK
21	21-Jun-26	6017.8	6035.0	17.2	0.0	17.2	0.0	SUPPORT RIPPING OB
22	22-Jun-26	6035.0	6041.7	6.7	0.0	5.9	0.8	SERVICE PM 1000
23	23-Jun-26	6041.7	6052.8	11.1	0.0	10.7	0.4	SUPPORT RIPPING DAN DOZZING OB
24	24-Jun-26	6052.8	6070.6	17.8	0.0	17.8	0.0	SUPPORT RIPPING OB
25	25-Jun-26	6070.6	6074.8	4.2	0.0	4.1	0.1	STANDBY RFU NO ORDER
26	26-Jun-26	6074.8	6087.8	13.0	0.0	12.8	0.2	SUPPORT RIPPING OB
27	27-Jun-26	6087.8	6098.0	10.2	0.0	10.2	0.0	SUPPORT RIPPING OB
28	28-Jun-26	6098.0	6114.5	16.5	0.0	16.5	0.0	SUPPORT RIPPING OB
29	29-Jun-26	6114.5	6128.9	14.4	0.0	14.4	0.0	SUPPORT RIPPING OB
30	30-Jun-26	6128.9	6139.6	10.7	0.0	10.7	0.0	SUPPORT RIPPING OB
TOTAL JAM OPERASI				262.8				Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (Coal Getting)					0.0			Nol Koma Nol Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (General OB)						250.7		Dua Ratus Lima Puluh Koma Tujuh Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT AAP							12.1	Dua Belas Koma Satu Jam

Tanjung Enim, Juli 2026

PIHAK KEDUA
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

ANDALAN

Juniariston Pasaribu
Penanggung Jawab Operasional

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

Taufin Toni
Senior Manajer Produksi

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

BERITA ACARA PERHITUNGAN AVAILABILITY ALAT BERAT

TYPE : Bulldozer Catepillar D10T (BDCT1001)
NOMOR : 510/SBS-Banko/PRO/VI/2026
PERIODE : 01 - 30 Juni 2026

Pada hari ini , Tanggal 01 Bulan Juli Tahun 2026 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Alat Berat dan SK Penunjukan Pelaksanaan Jasa sewa Alat Berat Kontrak SPPH: 05852, maka dibuat Berita Acara perhitungan availability alat berat periode 01 - 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JAM PEMAKAI		WAKTU HALANGAN		WAKTU STANDBY		TOTAL
		PT SBS	PT AAP	RUSAK	TIDAK ADA OPT	HUJAN	NO ORDER	
01	1-Jun-26	11.7	0.2	3.6	0.5	0.0	5.0	21.0
02	2-Jun-26	12.1	0.1	1.1	0.0	0.0	7.7	21.0
03	3-Jun-26	16.1	0.0	0.0	1.1	1.3	2.5	21.0
04	4-Jun-26	11.0	0.1	1.4	0.2	1.0	7.3	21.0
05	5-Jun-26	14.1	0.2	0.0	1.6	3.3	1.8	21.0
06	6-Jun-26	9.4	0.9	10.0	0.0	0.6	0.1	21.0
07	7-Jun-26	16.8	0.1	2.3	0.3	0.3	1.2	21.0
08	8-Jun-26	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0
09	9-Jun-26	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0
10	10-Jun-26	8.2	1.6	9.2	0.0	0.5	1.5	21.0
11	11-Jun-26	11.7	0.1	4.9	1.3	0.0	3.0	21.0
12	12-Jun-26	9.9	0.5	6.9	0.3	0.0	3.4	21.0
13	13-Jun-26	1.6	0.0	8.2	0.3	4.2	6.7	21.0
14	14-Jun-26	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0
15	15-Jun-26	0.3	0.0	20.2	0.0	0.0	0.5	21.0
16	16-Jun-26	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0
17	17-Jun-26	0.0	0.2	20.8	0.0	0.0	0.0	21.0
18	18-Jun-26	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0
19	19-Jun-26	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0
20	20-Jun-26	7.5	6.6	6.8	0.0	0.0	0.1	21.0
21	21-Jun-26	17.2	0.0	3.7	0.0	0.0	0.1	21.0
22	22-Jun-26	5.9	0.8	10.5	0.0	1.3	2.5	21.0
23	23-Jun-26	10.7	0.4	0.0	6.1	0.0	3.8	21.0
24	24-Jun-26	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	21.0
25	25-Jun-26	4.1	0.1	0.0	1.8	3.0	12.0	21.0
26	26-Jun-26	12.8	0.2	0.0	0.6	0.0	7.4	21.0
27	27-Jun-26	10.2	0.0	7.6	0.4	0.0	2.8	21.0
28	28-Jun-26	16.5	0.0	0.0	0.2	0.0	4.3	21.0
29	29-Jun-26	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	21.0
30	30-Jun-26	10.7	0.0	0.3	0.0	0.0	10.0	21.0
TOTAL JAM		250.7	12.1	243.5	14.7	15.5	93.5	630.0

RUMUS	$\frac{\text{Waktu Kerja Efektif + Waktu StandBy}}{\text{Waktu Krj + Waktu Hal + Waktu Stb}} \times 100$	=	% Real PA
Real PA	$\frac{262.8 + 109.0}{630.0} \times 100$	=	59.0%
RUMUS	$\frac{\text{Waktu Kerja Efektif}}{\text{Waktu Kerja + Waktu Halangan}} \times 100$	=	% Real MA
Real MA	$\frac{262.8}{262.8 + 258.2} \times 100$	=	50.4%

Tanjung Enim, Juli 2026

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Jonatiston Pasaribu
Penanggung Jawab Operasional

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

Okky Adhitya Anugrn
Manajer PKP & Project

Aswawi
Pjs. Manajer Produksi

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

BERITA ACARA JAM JALAN UNIT ALAT BERAT

TYPE : Bulldozer Caterpillar D10T (BDCT1002)
NOMOR :511 /SBS-Banko/PRO/ VI/2026
PERIODE : 01 - 30 Juni 2026

Pada hari ini , Tanggal 04 Bulan Juli Tahun 2026 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Alat Berat dan SK Penunjukan Pelaksanaan Jasa sewa Alat Berat Kontrak SPPH 05852, maka dibuat Berita Acara Jam Jalan Alat Berat Rental Pengoperasian berdasarkan Service Hour Meter (SHM) periode 01 - 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	S H M		JUMLAH JAM OPERASI	PEMAKAI			KETERANGAN
					PT SBS		PT AAP	
		AWAL	AKHIR		Coal Getting	General OB		
1	1-Jun-26	5994.2	6000.0	5.8	0.0	5.6	0.2	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
2	2-Jun-26	6000.0	6016.9	16.9	0.0	16.9	0.0	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
3	3-Jun-26	6016.9	6034.4	17.5	0.0	17.5	0.0	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
4	4-Jun-26	6034.4	6047.9	13.5	0.0	13.5	0.0	SUPPORT DOZING DAN RAWATAN DISPOSAL SEKATAN
5	5-Jun-26	6047.9	6063.3	15.4	0.0	14.9	0.5	SUPPORT DOZING DISPOSAL SEKATAN
6	6-Jun-26	6063.3	6070.6	7.3	0.0	5.5	1.8	SUPPORT DOZING DISPOSAL OB SEKATAN
7	7-Jun-26	6070.6	6081.5	10.9	0.0	10.8	0.1	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
8	8-Jun-26	6081.5	6095.4	13.9	0.0	13.9	0.0	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
9	9-Jun-26	6095.4	6110.5	15.1	0.0	15.0	0.1	SUPPORT RIPPING FRONT OB DAN RAWATAN FRONT
10	10-Jun-26	6110.5	6125.8	15.3	0.0	15.3	0.0	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
11	11-Jun-26	6125.8	6140.0	14.2	0.0	13.7	0.5	RIPPING BB
12	12-Jun-26	6140.0	6154.0	14.0	0.0	14.0	0.0	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
13	13-Jun-26	6154.0	6166.6	12.6	0.0	8.4	4.2	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
14	14-Jun-26	6166.6	6179.3	12.7	0.0	12.7	0.0	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
15	15-Jun-26	6179.3	6191.6	12.3	0.0	12.3	0.0	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
16	16-Jun-26	6191.6	6207.0	15.4	0.0	15.4	0.0	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
17	17-Jun-26	6207.0	6220.5	13.5	0.0	13.5	0.0	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
18	18-Jun-26	6220.5	6237.4	16.9	0.0	16.9	0.0	SUPPORT RIPPING DAN DOZING FRONT OB
19	19-Jun-26	6237.4	6249.6	12.2	0.0	12.2	0.0	SUPPORT DOZING DAN RIPPING FRONT OB
20	20-Jun-26	6249.6	6263.7	14.1	0.0	14.0	0.1	SUPPORT RIPPING BB
21	21-Jun-26	6263.7	6263.7	0.0	0.0	0.0	0.0	NO OPT
22	22-Jun-26	6263.7	6274.5	10.8	0.0	10.7	0.1	SUPPORT RIPPING BB
23	23-Jun-26	6274.5	6284.1	9.6	0.0	9.1	0.5	SUPPORT RIPPING BB
24	24-Jun-26	6284.1	6290.8	6.7	0.0	5.4	1.3	SUPPORT RIPPING BB
25	25-Jun-26	6290.8	6290.8	0.0	0.0	0.0	0.0	STANDBY . RFU NO ORDER
26	26-Jun-26	6290.8	6295.4	4.6	0.0	4.2	0.4	SUPPORT RIPPING OB
27	27-Jun-26	6295.4	6299.8	4.4	0.0	4.4	0.0	SUPPORT RIPPING OB
28	28-Jun-26	6299.8	6302.6	2.8	0.0	2.6	0.2	NO OPT
29	29-Jun-26	6302.6	6302.8	0.2	0.0	0.0	0.2	STANDBY . RFU
30	30-Jun-26	6302.8	6302.9	0.1	0.0	0.0	0.1	STANDBY . RFU WAITING INTRUCTION FROM CLIENT
TOTAL JAM OPERASI				308.7				Tiga Ratus Delapan Koma Tujuh jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (Coal Getting)					0.0			Nol Koma Nol Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (General OB)						298.4		Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Empat
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT AAP							10.3	Sepuluh Koma Tiga Jam

Tanjung Enim, Juli 2026

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

ANDALAN

Bonariston Pasaribu
Penanggung Jawab Operasional

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

Taufik Toni
Senior Manajer Produksi

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

BERITA ACARA PERHITUNGAN AVAILABILITY ALAT BERAT

TYPE : Bulldozer Caterpillar D10T (BDCT1002)
NOMOR :511/SBS-Banko/PROM/II/2026
PERIODE : 01 - 30 Juni 2026

Pada hari ini , Tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2026 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Alat Berat dan SK Penunjukan Pelaksanaan Jasa sewa Alat Berat Kontrak SPPH: 05852, maka dibuat Berita Acara perhitungan availability alat berat periode 01 - 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JAM PEMAKAI		WAKTU HALANGAN		WAKTU STANDBY		TOTAL
		PT SBS	PT AAP	RUSAK	TIDAK ADA OPT	HUJAN	NO ORDER	
01	1-Jun-26	5.6	0.2	1.7	9.6	0.0	3.9	21.0
02	2-Jun-26	16.9	0.0	0.0	0.2	0.0	3.9	21.0
03	3-Jun-26	17.5	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	21.0
04	4-Jun-26	13.5	0.0	0.0	1.0	1.0	5.5	21.0
05	5-Jun-26	14.9	0.5	0.0	0.2	1.1	4.3	21.0
06	6-Jun-26	5.5	1.8	10.1	0.0	0.6	3.0	21.0
07	7-Jun-26	10.8	0.1	0.0	0.7	0.0	9.4	21.0
08	8-Jun-26	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	21.0
09	9-Jun-26	15.0	0.1	0.0	0.0	2.2	3.7	21.0
10	10-Jun-26	15.3	0.0	0.3	0.4	0.5	4.5	21.0
11	11-Jun-26	13.7	0.5	0.4	0.0	0.0	6.4	21.0
12	12-Jun-26	14.0	0.0	2.5	0.0	0.0	4.5	21.0
13	13-Jun-26	8.4	4.2	8.3	0.0	0.0	0.1	21.0
14	14-Jun-26	12.7	0.0	0.0	0.0	2.4	5.9	21.0
15	15-Jun-26	12.3	0.0	0.0	0.3	2.1	6.3	21.0
16	16-Jun-26	15.4	0.0	0.0	1.6	0.0	4.0	21.0
17	17-Jun-26	13.5	0.0	0.0	0.7	0.0	6.8	21.0
18	18-Jun-26	16.9	0.0	0.0	0.4	0.0	3.7	21.0
19	19-Jun-26	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	21.0
20	20-Jun-26	14.0	0.1	0.0	0.3	0.0	6.6	21.0
21	21-Jun-26	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	21.0
22	22-Jun-26	10.7	0.1	0.0	3.4	1.3	5.5	21.0
23	23-Jun-26	9.1	0.5	0.0	5.3	0.0	6.1	21.0
24	24-Jun-26	5.4	1.3	0.0	0.0	0.0	14.3	21.0
25	25-Jun-26	0.0	0.0	0.0	10.8	3.0	7.2	21.0
26	26-Jun-26	4.2	0.4	0.0	0.5	0.0	15.9	21.0
27	27-Jun-26	4.4	0.0	0.0	0.3	0.0	16.3	21.0
28	28-Jun-26	2.6	0.2	0.0	10.5	0.0	7.7	21.0
29	29-Jun-26	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	20.5	21.0
30	30-Jun-26	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	19.9	21.0
TOTAL JAM		**298.4**	**10.3**	**23.3**	**68.5**	**15.5**	**214.0**	**630.0**

RUMUS	$\frac{\text{Waktu Kerja Efektif + Waktu StandBy}}{\text{Waktu Krj + Waktu Hul + Waktu Stb}} \times 100$	=	% Real PA
Real PA	$\frac{308.7 + 229.5}{630.0} \times 100$	=	85.4%
RUMUS	$\frac{\text{Waktu Kerja Efektif}}{\text{Waktu Kerja + Waktu Halangan}} \times 100$	=	% Real MA
Real MA	$\frac{308.7}{308.7 + 91.8} \times 100$	=	77.1%

Tanjung Enim, Juli 2026

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Jonriston Pasaribu
Penanggung Jawab Operasional

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

Okky Adhitya Anugra
Manajer PKR & Project

Asnawi
Pjs. Manajer Produksi

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

BERITA ACARA PERHITUNGAN AVAILABILITY ALAT BERAT

TYPE : EXCAVATOR CATERPILLAR 395 (EXCT3901)
NOMOR :512/SBS-Banko/PRO/VI/2026
PERIODE : 01 - 30 Juni 2026

Pada hari ini , Tanggal 29 Bulan Juli Tahun 2026 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Alat Berat dan SK Penunjukan Pelaksanaan Jasa sewa Alat Berat Kontrak SPPH: 05852, maka dibuat Berita Acara perhitungan availability alat berat periode 01 - 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JAM PEMAKAI		WAKTU HALANGAN		WAKTU STANDBY		TOTAL
		PT SBS	PT AAP	RUSAK	TIDAK ADA OPT	HUJAN	NO ORDER	
01	1-Jun-26	9.4	4.1	3.6	1.5	0.0	2.4	21.0
02	2-Jun-26	7.4	4.1	6.4	0.0	0.0	3.1	21.0
03	3-Jun-26	13.0	3.5	0.0	0.0	1.3	3.2	21.0
04	4-Jun-26	2.6	2.9	0.0	10.8	1.0	3.7	21.0
05	5-Jun-26	7.1	6.0	1.5	0.2	1.1	5.1	21.0
06	6-Jun-26	10.4	4.4	0.0	0.0	0.6	5.6	21.0
07	7-Jun-26	17.0	0.4	0.0	0.0	0.0	3.6	21.0
08	8-Jun-26	15.6	3.2	0.0	0.3	0.0	1.9	21.0
09	9-Jun-26	10.8	0.0	1.7	0.0	2.2	6.3	21.0
10	10-Jun-26	15.1	0.7	0.0	0.0	0.5	4.7	21.0
11	11-Jun-26	15.9	0.9	0.0	0.0	0.0	4.2	21.0
12	12-Jun-26	8.9	3.5	0.0	0.0	0.0	8.6	21.0
13	13-Jun-26	0.0	0.6	0.0	1.0	0.0	19.4	21.0
14	14-Jun-26	8.6	0.4	0.6	0.0	2.4	9.0	21.0
15	15-Jun-26	9.3	0.2	0.0	0.3	2.1	9.1	21.0
16	16-Jun-26	12.9	0.0	6.8	0.0	0.0	1.3	21.0
17	17-Jun-26	17.3	0.3	1.3	0.0	0.0	2.1	21.0
18	18-Jun-26	17.9	0.0	0.0	0.3	0.0	2.8	21.0
19	19-Jun-26	15.6	0.7	1.1	0.0	0.0	3.6	21.0
20	20-Jun-26	16.0	0.8	0.8	0.0	0.0	3.4	21.0
21	21-Jun-26	11.4	0.9	6.3	0.0	0.0	2.4	21.0
22	22-Jun-26	16.0	0.7	0.0	0.4	1.3	2.6	21.0
23	23-Jun-26	18.8	0.0	0.0	0.5	0.0	1.7	21.0
24	24-Jun-26	16.8	1.6	0.0	0.0	0.0	2.6	21.0
25	25-Jun-26	10.7	1.9	0.0	0.3	3.0	5.1	21.0
26	26-Jun-26	17.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.2	21.0
27	27-Jun-26	15.4	2.1	1.2	0.3	0.0	2.0	21.0
28	28-Jun-26	16.2	1.4	0.0	0.0	0.0	3.4	21.0
29	29-Jun-26	18.4	0.0	0.9	0.0	0.0	1.7	21.0
30	30-Jun-26	14.6	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	21.0
TOTAL JAM		386.3 ✓	48.3	32.2	16.7	15.5	131.0	630.0

RUMUS	Waktu Kerja Efektif + Waktu StandBy / Waktu Krj + Waktu Hal + Waktu Stb x 100	=	% Real PA
Real PA	434.6 + 146.5 / 630.0 x 100	=	92.2%
RUMUS	Waktu Kerja Efektif / Waktu Kerja + Waktu Halangan x 100	=	% Real MA
Real MA	434.6 / 434.6 + 48.9 x 100	=	89.9%

Tanjung Enim, Juli 2026

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

ANDALAN

Jonariston Pasaribu
Penanggung Jawab Operasional

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

Okky Adhitya Anugra
Manajer PKP & Project

Asnawi
Pjs. Manajer Produksi

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA JAM JALAN UNIT ALAT BERAT

TYPE : EXCAVATOR CATERPILLAR 395 (EXCT3901)
NOMOR :512/SBS-Banko/PRO/VII/2026
PERIODE : 01 - 30 Juni 2026

Pada hari ini , Tanggal 04 Bulan Juli Tahun 2026 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Alat Berat dan SK Penunjukan Pelaksanaan Jasa sewa Alat Berat Kontrak SPPH 05852, maka dibuat Berita Acara Jam Jalan Alat Berat Rental Pengoperasian berdasarkan Service Hour Meter (SHM) periode 01 - 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SHM		JUMLAH JAM OPERASI	PEMAKAI				KETERANGAN
					PT SBS			PT AAP	
		AWAL	AKHIR		Coal Getting	Loading OB	Rental SBS		
1	1-Jun-26	8421.6	8435.1	13.5	0.0	9.4	0.0	4.1	LOADING OB
2	2-Jun-26	8435.1	8446.6	11.5	0.0	7.4	0.0	4.1	LOADING OB
3	3-Jun-26	8446.6	8463.1	16.5	0.0	13.0	0.0	3.5	LOADING OB
4	4-Jun-26	8463.1	8468.6	5.5	0.0	2.6	0.0	2.9	NO OPERATOR
5	5-Jun-26	8468.6	8481.7	13.1	0.0	7.1	0.0	6.0	LOADING OB
6	6-Jun-26	8481.7	8496.5	14.8	0.0	10.4	0.0	4.4	LOADING OB
7	7-Jun-26	8496.5	8513.9	17.4	0.0	17.0	0.0	0.4	LOADING OB
8	8-Jun-26	8513.9	8532.7	18.8	0.0	15.6	0.0	3.2	LOADING OB
9	9-Jun-26	8532.7	8543.5	10.8	0.0	10.8	0.0	0.0	LOADING OB
10	10-Jun-26	8543.5	8559.3	15.8	0.0	15.1	0.0	0.7	LOADING OB
11	11-Jun-26	8559.3	8576.1	16.8	0.0	15.9	0.0	0.9	LOADING OB
12	12-Jun-26	8576.1	8588.5	12.4	0.0	5.8	3.1	3.5	LOADING OB DAN RENTAL SBS
13	13-Jun-26	8588.5	8589.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	STB LESS HAULER
14	14-Jun-26	8589.1	8598.1	9.0	0.0	0.0	8.6	0.4	RENTAL SBS
15	15-Jun-26	8598.1	8607.6	9.5	0.0	0.0	9.3	0.2	RENTAL SBS
16	16-Jun-26	8607.6	8620.5	12.9	0.0	4.6	8.3	0.0	LOADING OB DAN RENTAL SBS
17	17-Jun-26	8620.5	8638.1	17.6	0.0	17.3	0.0	0.3	LOADING OB
18	18-Jun-26	8638.1	8656.0	17.9	0.0	17.9	0.0	0.0	LOADING OB
19	19-Jun-26	8656.0	8672.3	16.3	0.0	15.6	0.0	0.7	LOADING OB
20	20-Jun-26	8672.3	8689.1	16.8	0.0	16.0	0.0	0.8	LOADING OB
21	21-Jun-26	8689.1	8701.4	12.3	0.0	3.1	8.3	0.9	LOADING OB DAN RENTAL SBS
22	22-Jun-26	8701.4	8718.1	16.7	0.0	0.0	16.0	0.7	RENTAL SBS
23	23-Jun-26	8718.1	8736.9	18.8	0.0	7.5	11.3	0.0	LOADING OB DAN RENTAL SBS
24	24-Jun-26	8736.9	8755.3	18.4	0.0	16.8	0.0	1.6	LOADING OB
25	25-Jun-26	8755.3	8767.9	12.6	0.0	10.7	0.0	1.9	LOADING OB
26	26-Jun-26	8767.9	8784.9	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	LOADING OB
27	27-Jun-26	8784.9	8802.4	17.5	0.0	15.4	0.0	2.1	LOADING OB
28	28-Jun-26	8802.4	8820.0	17.6	0.0	16.2	0.0	1.4	LOADING OB
29	29-Jun-26	8820.0	8838.4	18.4	0.0	18.4	0.0	0.0	LOADING OB
30	30-Jun-26	8838.4	8856.2	17.8	0.0	14.6	0.0	3.2	LOADING OB
TOTAL JAM OPERASI				434.6					Empat Ratus Tiga Puluh Empat Koma Enam Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (Coal Getting)					0.0				Nol Koma Nol Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (Loading OB)						321.4			Tiga Ratus Dua Puluh Satu Koma Empat Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (Rental SBS)							64.9		Enam Puluh Empat Koma Sembilan Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT AAP								48.3	Empat Puluh Delapan Koma Tiga Jam

Tanjung Enim, Juli 2026

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Jonariston Pasaribu
Penanggung Jawab Operasional

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

Tamrin Toni
Senior Manajer Produksi

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 :

PERHITUNGAN BERITA ACARA JAM JALAN EXCAVATOR 3901 PERIODE JUNI 2026

DATE	Loading Point	Front Loading	PTY	Volume
1 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	3,600 BCM
2 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	2,856 BCM
3 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	4,992 BCM
4 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	1,013 BCM
5 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	2,741 BCM
6 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	3,360 BCM
7 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	6,552 BCM
8 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	6,024 BCM
9 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	4,368 BCM
10 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	5,832 BCM
11 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	6,120 BCM
12 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	2,232 BCM
12 Jun 2026	PIT E SLINGSING		0 BCM	0 BCM
13 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	0 BCM	0 BCM
14 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	0 BCM	0 BCM
15 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	0 BCM	0 BCM
16 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	2,304 BCM
17 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,864 BCM
18 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	7,392 BCM
19 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	5,832 BCM
20 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,312 BCM
21 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	1,224 BCM
22 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	0 BCM	0 BCM
23 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	2,976 BCM
24 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,600 BCM
25 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	4,224 BCM
26 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,768 BCM
27 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,072 BCM
28 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,288 BCM
29 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	7,392 BCM
30 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	5,760 BCM
TOTAL			391.05 BCM	125,697.60 BCM
HM ACTUAL AAP			**434.6 Jam**	
HM RENTAL SBS			**64.9 Jam**	
HM ACTUAL SBS			**321.4 Jam**	

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

BERITA ACARA JAM JALAN UNIT ALAT BERAT

TYPE : EXCAVATOR CATERPILLAR 395 (EXCT3902)
NOMOR :5/3/SBS-Banko/PRO/VII/2026
PERIODE : 01 - 30 Juni 2026

Pada hari ini , Tanggal 30 Bulan Juli Tahun 2026 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Alat Berat dan SK Penunjukan Pelaksanaan Jasa sewa Alat Berat Kontrak SPPH 05852, maka dibuat Berita Acara Jam Jalan Alat Berat Rental Pengoperasian berdasarkan Service Hour Meter (SHM) periode 01 - 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	S H M		JUMLAH JAM OPERASI	PEMAKAI				KETERANGAN
					PT SBS			PT AAP	
		AWAL	AKHIR		Coal Getting	Loading OB	Rental SBS		
1	1-Jun-26	9289.6	9306.5	16.9	0.0	11.6	0.0	5.3	LOADING OB
2	2-Jun-26	9306.5	9324.2	17.7	0.0	14.0	0.0	3.7	LOADING OB
3	3-Jun-26	9324.2	9339.4	15.2	0.0	10.1	0.0	5.1	LOADING OB
4	4-Jun-26	9339.4	9350.7	11.3	0.0	7.2	0.0	4.1	LOADING OB
5	5-Jun-26	9350.7	9364.9	14.2	0.0	10.0	0.0	4.2	LOADING OB
6	6-Jun-26	9364.9	9381.0	16.1	0.0	7.7	0.0	8.4	LOADING OB
7	7-Jun-26	9381.0	9386.7	5.7	0.0	4.9	0.0	0.8	LOADING OB
8	8-Jun-26	9386.7	9402.1	15.4	0.0	12.8	0.0	2.6	LOADING OB
9	9-Jun-26	9402.1	9413.9	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	LOADING OB
10	10-Jun-26	9413.9	9431.0	17.1	0.0	16.7	0.0	0.4	LOADING OB
11	11-Jun-26	9431.0	9442.9	11.9	0.0	10.8	0.0	1.1	LOADING OB
12	12-Jun-26	9442.9	9459.2	16.3	0.0	14.4	0.0	1.9	LOADING OB
13	13-Jun-26	9459.2	9476.6	17.4	0.0	16.9	0.0	0.5	LOADING OB
14	14-Jun-26	9476.6	9491.2	14.6	0.0	12.9	0.0	1.7	LOADING OB
15	15-Jun-26	9491.2	9498.8	7.6	0.0	6.7	0.0	0.9	LOADING OB
16	16-Jun-26	9498.8	9515.8	17.0	0.0	16.9	0.0	0.1	LOADING OB
17	17-Jun-26	9515.8	9531.9	16.1	0.0	0.0	15.6	0.5	RENTAL SBS
18	18-Jun-26	9531.9	9548.4	16.5	0.0	0.0	16.5	0.0	RENTAL SBS
19	19-Jun-26	9548.4	9565.2	16.8	0.0	0.0	15.6	1.2	RENTAL SBS
20	20-Jun-26	9565.2	9581.2	16.0	0.0	0.0	6.9	9.1	RENTAL SBS
21	21-Jun-26	9581.2	9598.8	17.6	0.0	17.6	0.0	0.0	LOADING OB
22	22-Jun-26	9598.8	9615.9	17.1	0.0	17.1	0.0	0.0	LOADING OB
23	23-Jun-26	9615.9	9633.7	17.8	0.0	14.1	0.0	3.7	LOADING OB
24	24-Jun-26	9633.7	9653.1	19.4	0.0	18.5	0.0	0.9	LOADING OB
25	25-Jun-26	9653.1	9666.2	13.1	0.0	10.6	0.0	2.5	LOADING OB
26	26-Jun-26	9666.2	9683.9	17.7	0.0	16.0	0.0	1.7	LOADING OB
27	27-Jun-26	9683.9	9701.4	17.5	0.0	16.0	0.0	1.5	LOADING OB
28	28-Jun-26	9701.4	9719.4	18.0	0.0	16.3	0.0	1.7	LOADING OB
29	29-Jun-26	9719.4	9738.1	18.7	0.0	18.0	0.0	0.7	LOADING OB
30	30-Jun-26	9738.1	9755.0	16.9	0.0	16.3	0.0	0.6	LOADING OB
TOTAL JAM OPERASI				465.4					Empat Ratus Enam Puluh Lima Koma Empat Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (Coal Getting)					0.0				Nol Koma Nol Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (General OB)						346.0			Tiga Ratus Empat Puluh Enam Koma Nol Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT SBS (Rental SBS)							54.6		Lima Puluh Empat Koma Enam Jam
TOTAL JAM OPERASI DIPAKAI PT AAP								64.8	Enam Puluh Empat Koma Delapan Jam

Tanjung Enim, Juli 2026

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Jonariston Pasaribu
Penanggung Jawab Operasional

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

Tedja Toni
Senior Manajer Produksi

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

BERITA ACARA PERHITUNGAN AVAILABILITY ALAT BERAT

TYPE : EXCAVATOR CATERPILLAR 395 (EXCT3902)
NOMOR : 513/SBS-Banko/PRONI/2026
PERIODE : 01 - 30 Juni 2026

Pada hari ini , Tanggal 14 Bulan Juli Tahun 2026 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Alat Berat dan SK Penunjukan Pelaksanaan Jasa sewa Alat Berat Kontrak SPPH: 05852, maka dibuat Berita Acara perhitungan availability alat berat periode 01 - 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JAM PEMAKAI		WAKTU HALANGAN		WAKTU STANDBY		TOTAL
		PT SBS	PT AAP	RUSAK	TIDAK ADA OPT	HUJAN	NO ORDER	
01	1-Jun-26	11.6	5.3	0.0	0.5	0.0	3.6	21.0
02	2-Jun-26	14.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.3	21.0
03	3-Jun-26	10.1	5.1	0.0	0.0	1.3	4.5	21.0
04	4-Jun-26	7.2	4.1	0.0	0.7	1.0	8.0	21.0
05	5-Jun-26	10.0	4.2	0.0	0.3	1.1	5.4	21.0
06	6-Jun-26	7.7	8.4	0.0	1.2	0.6	3.1	21.0
07	7-Jun-26	4.9	0.8	13.3	0.3	0.0	1.7	21.0
08	8-Jun-26	12.8	2.6	2.8	0.3	0.0	2.5	21.0
09	9-Jun-26	11.8	0.0	0.0	0.0	2.2	7.0	21.0
10	10-Jun-26	16.7	0.4	0.0	0.0	0.5	3.4	21.0
11	11-Jun-26	10.8	1.1	0.0	0.3	0.0	8.8	21.0
12	12-Jun-26	14.4	1.9	0.0	0.0	0.0	4.7	21.0
13	13-Jun-26	16.9	0.5	0.0	0.5	0.0	3.1	21.0
14	14-Jun-26	12.9	1.7	0.0	0.0	2.4	4.0	21.0
15	15-Jun-26	6.7	0.9	0.0	0.4	2.1	10.9	21.0
16	16-Jun-26	16.9	0.1	0.0	0.3	0.0	3.7	21.0
17	17-Jun-26	15.6	0.5	0.7	2.4	0.0	1.8	21.0
18	18-Jun-26	16.5	0.0	0.0	2.3	0.0	2.2	21.0
19	19-Jun-26	15.6	1.2	0.0	0.0	0.0	4.2	21.0
20	20-Jun-26	6.9	9.1	0.0	0.3	0.0	4.7	21.0
21	21-Jun-26	17.6	0.0	0.1	1.0	0.0	2.3	21.0
22	22-Jun-26	17.1	0.0	0.0	0.0	1.3	2.6	21.0
23	23-Jun-26	14.1	3.7	0.0	0.3	0.0	2.9	21.0
24	24-Jun-26	18.5	0.9	0.0	0.4	0.0	1.2	21.0
25	25-Jun-26	10.6	2.5	0.0	0.3	3.0	4.6	21.0
26	26-Jun-26	16.0	1.7	0.0	0.6	0.0	2.7	21.0
27	27-Jun-26	16.0	1.5	0.0	0.3	0.0	3.2	21.0
28	28-Jun-26	16.3	1.7	0.0	0.0	0.0	3.0	21.0
29	29-Jun-26	18.0	0.7	0.0	0.0	0.0	2.3	21.0
30	30-Jun-26	16.3	0.6	0.0	0.0	0.0	4.1	21.0
TOTAL JAM		400.6	64.8	16.9	12.7	15.5	119.5	630.0

RUMUS	$\frac{\text{Waktu Kerja Efektif + Waktu StandBy}}{\text{Waktu Krj + Waktu Hal + Waktu Stb}} \times 100$	=	% Real PA
Real PA	$\frac{465.4 + 135.0}{630.0} \times 100$	=	95.3%
RUMUS	$\frac{\text{Waktu Kerja Efektif}}{\text{Waktu Kerja + Waktu Halangan}} \times 100$	=	% Real MA
Real MA	$\frac{465.4}{465.4 + 29.6} \times 100$	=	94.0%

Tanjung Enim, Juli 2026

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

ANDALAN

Jonariston Pasaribu
Penanggung Jawab Operasional

PIHAK PERTAMA
PT SATRIA BAHANA SARANA

Okky Adhitya Anugra
Manajer PKP & Project

Asnawi
Pjs. Manajer Produksi

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 :

PERHITUNGAN BERITA ACARA JAM JALAN EXCAVATOR 3902 PERIODE JUNI 2026

DATE	Loading Point	Front Loading	PTY	Volume
1 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM ✓	4,464 BCM
2 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	5,400 BCM
3 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	3,888 BCM
4 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	2,760 BCM
5 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	3,864 BCM
6 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	2,952 BCM
7 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	1,896 BCM
8 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	4,944 BCM
9 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	4,560 BCM
10 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	6,432 BCM
11 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM	4,176 BCM
12 Jun 2026	PIT E SELATAN	PIT E SBS	385 BCM ✓	2,544 BCM
	PIT E SLINGSING		395 BCM	3,072 BCM
13 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,672 BCM
14 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	5,112 BCM
15 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	2,664 BCM
16 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,672 BCM
17 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	0 BCM	0 BCM
18 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	0 BCM	0 BCM
19 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	0 BCM	0 BCM
20 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	0 BCM	0 BCM
21 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	7,176 BCM
22 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	7,056 BCM
23 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	5,016 BCM
24 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	7,320 BCM
25 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	4,176 BCM
26 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,336 BCM
27 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,312 BCM
28 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,432 BCM
29 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	7,104 BCM
30 Jun 2026	PIT E SLINGSING	PIT E SBS	395 BCM	6,432 BCM
TOTAL			391.46 BCM	135,432.00 BCM
HM ACTUAL AAP			**465.4 Jam**	
HM RENTAL SBS			**54.6 Jam**	
HM ACTUAL SBS			**346.0 Jam**	

Dipindai dengan CamScanner

ROUTING SLIP

No Dok :
No Rev : 1
Halaman : 1 dari 1

Subkontraktor : PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
Kontrak : SPPH 05852
Periode : ~~Mei 2026~~ Juni 2026
Tagihan ke dari 60

NO	Alur Proses	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	Pembuatan Renja Oleh Pihak Sub Kontraktor		sesuai diskusi dengan team perencanaan	
2	Pemeriksaan oleh Pihak Engineering PT. SBS	17/6/26	ok	
3	Pemeriksaan dan Persetujuan Renja Oleh Manager Perencanaan Tambang	17/6/26		
4	Pemeriksaan Dan Persetujuan oleh PM PT. SBS	18/6-26		
7	Pemeriksaan dan Persetujuan BA oleh Manajer Produksi / Manajer Layanan Penunjang Tambang	18/6-26		

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
SITE PIT SELATAN (EXTENSION) & PIT SELINGSING
PERIODE: 01 - 13 Juni 2026 (Pit Extension) 13-30 Juni 2026 (Pit Selingsing)

Pit Selatan (Extension)

Material: Clay

EQUIPMENT				DISTANCE (M)	PRODUCTIVITY (BCM/Hrs)		EWH (Jam)	FLEET PDTY (Bcm/Jam)	FLEET CAP. (BCM)
FLEET 1	LOADER	EXCT3901	CAT 395	2000	MATCH FACTOR	1.00	140.66	385 ✓	54,161
	HAULER	HAULER QTY			LOADER PDTY	385			
		OHT 773	6		OHT 773 PDTY	64.2			
		TR50D			TR50D PDTY	0.0			
FLEET 2	LOADER	EXCT3902	CAT 395	2000	MATCH FACTOR	1.00	140.66	385	54,161
	HAULER	HAULER QTY			LOADER PDTY	385			
		OHT 773	6		OHT 773 PDTY	64.2			
		TR50D			TR50D PDTY	0.0			
TOTAL				2000			140.66	385	108,321

TOTAL PIT SELATAN (EXTENSION)

EQUIPMENT	DISTANCE (M)	PRODUCTIVITY (BCM/Hrs)	EWH (Jam)	VOLUME (BCM)
FLEET 1 - EXCT3901	2000	385	141	54,160.5
FLEET 2 - EXCT3902	2000	385	141	54,160.5
TOTAL	2000	385	141	108,321

TOTAL BULAN JUNI

PARAMETER	Target
OB Volume (BCM)	233,530
OB Distance (m)	2804
EWH (Hours)	299
Productivity (BCM/Hours)	390

Pit Selingsing

Material: Clay

EQUIPMENT				DISTANCE (M)	PRODUCTIVITY (BCM/Hrs)		EWH (Jam)	FLEET PDTY (Bcm/Jam)	FLEET CAP. (BCM)
FLEET 1	LOADER	EXCT3901	CAT 395	3500	MATCH FACTOR	1.00	129.72	395 ✓	51,222
	HAULER	HAULER QTY			LOADER PDTY	395			
		OHT 773	9		OHT 773 PDTY	43.9			
		TR50D			TR50D PDTY	0.0			
FLEET 2	LOADER	EXCT3902	CAT 395	3500	MATCH FACTOR	1.00	187.37	395	73,987
	HAULER	HAULER QTY			LOADER PDTY	395			
		OHT 773	9		OHT 773 PDTY	43.9			
		TR50D			TR50D PDTY	0.0			
TOTAL				3500			163.79	395	125,209

TOTAL PIT SLINGSING

EQUIPMENT	DISTANCE (M)	PRODUCTIVITY (BCM/Hrs)	EWH (Jam)	VOLUME (BCM)
FLEET 1 - EXCT3901	3500	395	130	51,221.8
FLEET 2 - EXCT3902	3500	395	187	73,987.1
TOTAL	3500	395	159	125,209

PT . ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Jonariston Pasaribu
PJO

PT . SATRIA BAHANA SARANA

Mamat Rachmat
Manager Perencanaan Tambang

Tapeh Toni
SM. Produksi

Xaverius Ferry Tharob
Project Manager

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN TANAH
SERTA PENGUKURAN JARAK ANGKUT RATA-RATA TANAH
PAKET : SPPH 5852
PERIODE : 01 JUNI 2026 – 30 JUNI 2026

No : 297.1/BA-BSMS/VII/2026

Pada hari Ini Jumat tanggal 02 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Tanjung Enim, dibuat Berita Acara Penggalian dan Pengangkutan Tanah serta pengukuran Jarak Angkut Rata – rata oleh dan antara :

1. PT. SATRIA BAHANA SARANA, Selaku pemberi tugas yang diwakili oleh Project Manager selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dan

2. PT. Andalan Artha Primanusa, selaku pelaksana yang diwakili oleh Penanggung Jawab Operasional (PJO), Selanjutanya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ditanda-tanganinya Berita Acara ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan Penggalian dan Pemindahan Tanah dengan Volume dan Jarak Angkut Rata - rata, sebagai berikut :

No	Lokasi			Volume	Jarak Rata-Rata
	Loading	Material	Dumping	(BCM)	(M)
1	PIT E	CLAY	DISPOSAL SEKATAN	82,608.00	3.040
2	PIT E	CLAY	RENCANA JALAN	24,480.00	1.320
3	PIT E	CLAY	RENCANA CSA	456.00	0.700
4	PIT E	CLAY	JALAN BARITO	34,776.00	1.995
5	PIT E	CLAY	SEKATAN	114,024.00	2.089
6	PIT E	CLAY	TS MAHONI	1,584.00	3.018
7	PIT E	CLAY	IPD WATERFILL	3,960.00	0.605
8	PIT E	LUMPUR	SEKATAN	1,166.40	1.907
Total Penggalian dan Pemindahan Tanah (SR)				**263,054.40**	**2.284**

Dan PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik Volume dan Jarak Angkut Rata - rata Pemindahan Tanah, dengan rincian sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA	**PT. SATRIA BAHANA SARANA**
for ANDALAN	
JONARISTON PASARIBU	**TANKIN TONI**
PJO	**SENIOR MANAGER**

Dipindai dengan CamScanner

PRODUKSI TANAH HARIAN BERDASARKAN RITASE
PT. Andalan Artha Primanusa
LOKASI PIT E
Periode 01 Juni 2026 s/d 30 Juni 2026
SPPH 5052

TANGGAL	OVERBURDEN																											
	DISPOSAL REKATAK			RENCANA JALAN			RENCANA CRA			JALAN BARITO			BEKATAN (CLAY)			BEKATAN (LUMPUR)			TS MARGA			IPD WATERFILL			TOTAL TANAH (BCM)		
	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK	BCM	JARAK (KM)	BCM X JRK
1 Jun 26	0.00			0.00			0.00			0.00			6,112.00	2.10	17,235.20	0.00			0.00			0.00			6,112.00	2.10	17,235.20
2 Jun 26	0.00			0.00			0.00			0.00			7,656.00	2.10	16,077.60	0.00			0.00			0.00			7,656.00	2.10	16,077.60
3 Jun 26	0.00			0.00			0.00			0.00			9,722.00	2.10	20,412.00	0.00			0.00			0.00			9,722.00	2.10	20,412.00
4 Jun 26	0.00			0.00			0.00			0.00			4,608.00	2.10	9,676.80	417.86	2.10	876.94	0.00			0.00			5,025.86	2.10	10,553.74
5 Jun 26	0.00			0.00			0.00			0.00			3,936.00	1.85	7,281.60	748.86	1.85	1,385.64	0.00			0.00			4,684.86	1.85	8,667.24
6 Jun 26	0.00			0.00			0.00			0.00			9,336.00	1.85	16,904.80	0.00			0.00			0.00			9,336.00	1.80	16,804.80
7 Jun 26	0.00			0.00			0.00			0.00			4,872.00	1.85	8,788.80	0.00			0.00			0.00			4,872.00	1.80	8,768.80
8 Jun 26	0.00			0.00			0.00			0.00			10,704.00	1.85	19,267.20	0.00			0.00			0.00			10,704.00	1.80	19,267.20
9 Jun 26	0.00			2,496.00	1.52	3,794.88	0.00			0.00			10,056.00	1.85	18,900.80	0.00			0.00			0.00			12,552.00	1.74	21,895.68
10 Jun 26	0.00			4,368.00	0.53	2,304.00	0.00			0.00			4,752.00	1.51	7,171.20	0.00			0.00			0.00			9,120.00	1.04	9,475.20
11 Jun 26	0.00			2,256.00	0.53	1,192.80	0.00			0.00			7,800.00	1.69	14,668.00	0.00			0.00			0.00			10,056.00	1.58	15,885.80
12 Jun 26	1,560.00	3.30	5,584.80	0.00			0.00			0.00			8,448.00	2.03	17,180.00	0.00			0.00			0.00			8,528.00	2.18	20,724.00
13 Jun 26	6,624.00	3.08	21,405.55	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,624.00	3.29	21,405.55
14 Jun 26	5,328.00	3.00	15,984.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			5,328.00	3.00	15,984.00
15 Jun 26	3,240.00	3.00	9,720.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3,240.00	3.00	9,720.00
16 Jun 26	2,304.00	3.00	6,912.00	5,448.00	0.52	2,724.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7,752.00	1.24	9,636.00
17 Jun 26	0.00			1,608.00	0.52	804.00	0.00			0.00			5,472.00	2.73	13,268.80	0.00			0.00			0.00			7,080.00	2.27	15,072.80
18 Jun 26	6,240.00	3.00	15,540.00	0.00			0.00			0.00			5,544.00	2.80	15,523.20	0.00			0.00			0.00			10,560.00	2.90	30,571.20
19 Jun 26	6,048.00	3.00	18,144.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,048.00	3.00	18,144.00
20 Jun 26	6,192.00	3.00	18,576.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6,192.00	3.00	18,576.00
21 Jun 26	4,128.00	3.67	12,801.95	720.00	1.85	1,425.95	0.00			1,200.00	1.13	1,362.40	1,368.00	2.85	4,256.80	0.00			0.00			0.00			7,560.00	2.80	19,846.40
22 Jun 26	0.00			3,432.00	3.10	10,639.20	0.00			1,224.00	1.00	1,224.00	3,312.00	2.95	8,604.80	0.00			0.00			600.00	0.80	360.00	8,568.00	2.56	21,828.00
23 Jun 26	0.00			4,560.00	2.31	8,444.00	0.00			0.00			1,128.00	2.95	3,271.20	0.00			0.00			1,398.00	0.80	800.80	6,576.00	2.26	13,536.00
24 Jun 26	5,832.00	3.00	17,496.00	0.00			0.00			4,488.00	1.81	4,131.20	1,656.00	2.80	4,802.40	0.00			0.00			192.00	0.70	134.40	12,168.00	2.51	30,564.00
25 Jun 26	4,128.00	3.00	12,384.00	0.00			0.00			4,920.00	1.85	9,348.00	0.00			0.00			0.00			0.00			9,048.00	2.40	21,732.00
26 Jun 26	7,248.00	3.00	22,152.80	0.00			0.00			5,256.00	2.05	10,781.80	0.00			0.00			0.00			0.00			12,456.00	2.64	32,858.40
27 Jun 26	6,096.00	3.06	27,729.80	0.00			456.00	0.70	319.20	3,840.00	2.26	8,681.80	0.00			0.00			0.00			0.00			13,392.00	2.74	36,730.40
28 Jun 26	5,040.00	3.08	15,667.40	0.00			0.00			6,696.00	2.24	14,997.60	0.00			0.00			792.00	3.40	2,692.80	0.00			12,528.00	2.65	33,137.52
29 Jun 26	6,840.00	3.08	21,067.40	0.00			0.00			4,560.00	2.13	8,665.80	0.00			0.00			720.00	2.50	1,872.00	0.00			12,120.00	2.77	33,745.60
30 Jun 26	2,112.00	3.13	6,607.20	0.00			0.00			3,120.00	2.00	6,240.00	5,520.00	2.85	15,456.00	0.00			72.00	3.00	216.00	1,800.00	2.80	1,260.00	12,624.00	2.34	29,539.20
1 Jul 26	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
Total Average	67,808.00	3.04	251,098.10	24,480.00	1.32	32,318.40	456.00	0.70	319.20	34,776.00	1.99	69,372.20	134,524.00	2.00	293,145.60	1,165.43	1.91	2,234.80	1,584.00	3.02	4,780.80	3,960.00	0.80	2,395.20	253,654.43	2.293	503,094.32

Dibuat Oleh
PT. Andalan Artha Primanusa

Diperiksa Oleh
PT. Satria Bahana Sarana

Dikty Adhitya Anggrah
Manager PKPP

Agusteri
Pj. Manager Produksi

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA

RECONSILE VOLUME OB PERIODE JUNI 2026

PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Pada hari Jum'at tanggal 09 bulan Juli tahun 2026, di Tanjung Enim, dibuat Berita Acara reconcile loss volume pengambilan OB berdasarkan kontribusi masing masing pihak.

Berdasarkan rekonsiliasi antara PT. SBS dan PT. AAP Loss data dari **Road Condition** dan diukur menggunakan travel speed yang direkam oleh ***Application Severity Index Report***. disepakati bersama antara PT. AAP dan PT. SBS sebesar 18,44 KM/Jam dari plan travel speed 22 KM/Jam terdapat deviasi sebesar -3,56 KM/Jam dari data plan, sehingga mengakibatkan loss productivity dari hauler sebesar - **28,242 BCM.**

Selanjutnya, dari penyebab diatas dapat dibagi kontribusi masing masing pihak, sebagai berikut :

Kontribusi Loss PT. SBS
Road Condition : - 28,242 BCM
Kontribusi Loss PT. AAP
Loss due to idle : - 21,687 BCM


Berdasarkan kontribusi masing masing pihak diatas, maka disepakati bahwa kontribusi loss PT. SBS dapat dijadikan penyesuaian ke volume realisasi PT. AAP.
Demikian berita acara reconcile ini dibuat, atas dasar kesepakatan bersama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA	PT. SATRIA BAHANA SARANA
JONARISTON PASARIBU	XAVERIUS FERRY THAROB
PJO	PROJECT MANAGER

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 :

WATERFALL OB

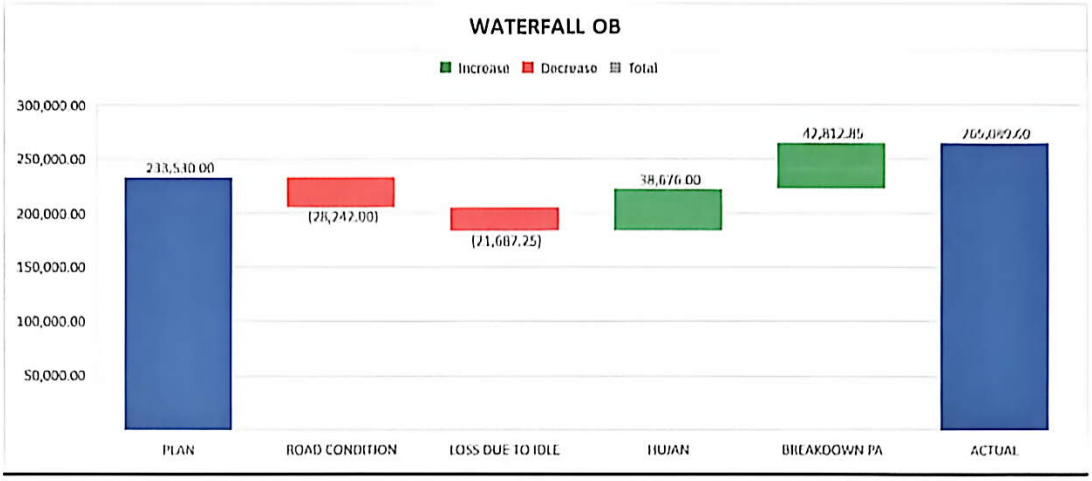

Remarks :

Secara keseluruhan, produksi OB mencapai 265,089.60 BCM, atau 31,559.60 BCM di atas rencana. Kerugian akibat road condition (-28,242 BCM) dan idle time (-21,687 BCM) berhasil dikompensasi oleh peningkatan kinerja dari availability alat (Breakdown PA +42,813 BCM) dan optimalisasi operasi pada kondisi cuaca yang mendukung (+38,676 BCM). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keandalan alat dan efektivitas operasional menjadi faktor utama yang mendorong pencapaian produksi melebihi target.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2 :

HAULER	Volume	EWH - Avg (Hr)	Distance		Productivity	
	Monthly	Monthly	Plan	Monthly	Plan	Monthly
HDCT7301	-	-	2800	0	69.00	-
HDCT7302	20,539.20	341.60	2800	2285	69.00	60.13
HDCT7303	22,723.20	382.60	2800	2331	69.00	59.39
HDCT7304	21,912.00	357.30	2800	2210	69.00	61.33
HDCT7305	18,024.00	299.40	2800	2198	69.00	60.20
HDCT7306	22,161.60	382.30	2800	2384	69.00	57.97
HDCT7307	20,889.60	359.40	2800	2385	69.00	58.12
HDCT7308	16,296.00	286.40	2800	2312	69.00	56.90
HDCT7309	21,864.00	391.50	2800	2386	69.00	55.85
HDCT7310	19,104.00	355.50	2800	2434	69.00	53.74
HDCT7311	20,256.00	375.60	2800	2388	69.00	53.93
HDCT7312	19,704.00	361.40	2800	2365	69.00	54.52
HDCT7314	5,256.00	93.90	2800	2499	69.00	55.97
HDCT7315	6,000.00	100.10	2800	2403	69.00	59.94
HDCT7316	5,712.00	95.00	2800	2367	69.00	60.13
HDCT7317	5,880.00	100.00	2800	2430	69.00	58.80
HDCT7318	4,944.00	85.70	2800	2436	69.00	57.69
HDCT7319	4,296.00	61.20	2800	2364	69.00	70.20
HDCT7320	4,968.00	88.50	2800	2545	69.00	56.14
HDCT7321	4,560.00	61.50	2800	2373	69.00	74.15
Total	265,089.60	4,578.90	2,800	2,286	69.00	58.10
					-10.90	
					-49929 Bcm	

Remarks :

Berdasarkan Tabel diatas realisasi aktual productivity hauler periode Juli sebesar 58,10 Bcm/Jam dari target 69 Bcm/Jam sehingga terdapat deviasi -10,90 Bcm/Jam atau Loss dikarenakan Pty sebesar -49,929 Bcm. Yang mana kontribusi dari ketidak tercapaian speed / road condition sebagai berikut :

Tabel Perhitungan Loss Volume base on Speed Actual :

Perhitungan Loss Volume					
Hauler 773	Menit	Hours		Plan TS	
Cycle Time Load	12.38	0.21	Jam	0.17	
Cycle Time Empty	7.44	0.12	Jam	0.10	
Cyc Loading	2.00	0.03	Jam	0.04	
Cyc Dumping	1.10	0.02	Jam	0.03	
Total Cycle Time	22.92	0.38	Jam	0.35	
Distance		2.29	KM	2.29	Deviasi
Speed Hauler		18.44	KM / Jam	22.00	(3.56)
Prodty		62.83		69.00	
Plan Prodty		69.00		69.00	
WH Hauler		4,578.90		4,578.90	
Volume Actual		287,702.45		315,944	
Volume Plan		315,944.10		315,944	
Deviasi		28,242		(0)	

Berdasarkan Perhitungan diatas dengan actual travel speed 18,44 Km/Jam didapatkan loss volume yang diakibatkan dari road condition sebesar **-28,242 Bcm**.

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

BERITA ACARA
PENGGUNAAN BBM SOLAR PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSIA
Nomor : 682/BAST-FUEL/SBS/VI/2026

Pada Hari ini Rabu, Tanggal 01 Juli tahun 2026, di Tanjung Enim dibuat Berita Acara pemakaian BBM Solar berdasarkan aktifitas pekerjaan.

1. PT. SATRIA BAHANA SARANA, Selaku pemberi BBM Solar yang diwakili oleh Project Manager Unit Banko, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

   Dan

2. PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA, Selaku pengguna BBM Solar yang diwakili oleh Penanggung Jawab Operasional, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berikut rincian data pemakaian BBM Solar periode 01 Juni 2026 – 30 Juni 2026 dengan total pemakaian (rincian terlampir) :

Total pemakaian BBM Solar Unit PT. AAP : 301.569 Liter

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Enim, 01 Juli 2026

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PJO	Project Manager Unit Banko
JONARISTON PASARIBU	**XAVERIUS FERRY THAROB**

PT SATRIA BAHANA SARANA
Mining Solution
Kantor Pusat
Jl. Jurang Parigi Dalam No. 5 Tanjung Enim
Muara Enim - Sumatera Selatan 31716
Tlp.+62734 453035 Fax. +62734 453039

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

➢ Rincian data unit pemakaian BBM Solar PT. Andalan Artha Primanusa :

No.	No. Unit	No. Elipse	Qty (liter)	Keterangan
1	APDZ1001	APDZ10-001	20.683	
2	APDZ1002	APDZ10-002	22.646	
3	APEX01	EXCT3901	27.161	
4	APEX02	EXCT3902	27.345	
		TOTAL	97.835	LITER
5	APHD01	HDCT7301	0	Unit Breakdown
6	APHD02	HDCT7302	14.705	
7	APHD03	HDCT7303	16.191	
8	APHD04	HDCT7304	15.396	
9	APHD05	HDCT7305	13.250	
10	APHD06	HDCT7306	17.090	
11	APHD07	HDCT7307	16.332	
12	APHD08	HDCT7308	11.785	
13	APHD09	HDCT7309	16.447	
14	APHD10	HDCT7310	15.162	
15	APHD11	HDCT7311	15.890	
16	APHD12	HDCT7312	14.917	
17	APHD14	HDCT7314	4.809	
18	APHD15	HDCT7315	5.385	
19	APHD16	HDCT7316	4.846	
20	APHD17	HDCT7317	5.333	
21	APHD18	HDCT7318	4.338	
22	APHD19	HDCT7319	3.765	
23	APHD20	HDCT7320	4.210	
24	APHD21	HDCT7321	3.883	
		TOTAL	203.734	LITER

Total Keseluruhan Penggunaan Solar/BBM PT AAP Pada Periode Juni 2026 adalah **301.569** Liter.

PT SATRIA BAHANA SARANA
Mining Solution
Kantor Pusat
Jl. Jurang Parigi Dalam No. 5 Tanjung Enim
Muara Enim - Sumatera Selatan 31716
Tlp.+62734 453035 Fax. +62734 453039

Dipindai dengan CamScanner

Mining Solution

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

BERITA ACARA
HASIL UJI PETIK PENGGUNAAN BBM UNIT SUBKONTRAKTOR
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
Nomor : ….. /SBS-Banko/PM/IV/2026

Pada Hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-04-2026), di Tanjung Enim dibuat Berita Acara Hasil Uji Petik penggunaan BBM antara :

1. **PT. SATRIA BAHANA SARANA**, Selaku pemberi tugas yang diwakili oleh Project Manager, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

   Dan

2. **PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA**, Selaku pelaksana tugas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan uji petik yang telah dilaksanakan Maret sampai dengan Selesai dengan acuan minimal seratus jam kerja Unit (100 HM) untuk pengambilan data standarisasi pemakaian BBM unit.

Maka didapatkan data-data sebagai berikut :

NO	Kode Lambung	Model / Seri	Total Liter	Total HM	FC	Kesepakatan (Ltr/ HM)
1	APEX01	CATERPILLAR EX 395	8.038	104,20	77,14	**76,88**
2	APEX02	CATERPILLAR EX 395	8.680	113,30	76,61	
3	APDZ1001	CAT D10 T	8.331	104,00	80,11	**80,82**
4	APDZ1002	CAT D10 T	8.496	104,20	81,54	
5	APHD	CAT OHT 773	3.709	68,47	54,17	**54,17**

Nilai hasil uji petik pemakaian BBM berlaku sejak :

1. Februari 2026 sampai Juli 2026 atau sampai uji petik selanjutnya.
2. Angka yang disepakati berlaku untuk Seluruh Unit dengan type yang sama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan acuan standar penggunaan BBM di PT.SBS. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanjung Enim, 16 April 2026

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

JONARISTON PASARIBU
PJO

PIHAK PERTAMA
PT.SATRIA BAHANA SARANA

XAVERIUS FERRY THAROB
Project Manajer Unit Banko

PT SATRIA BAHANA SARANA
Mining Solution
Kantor Pusat
Jl. Jurang Parigi Dalam No. 6 Tanjung Enim
Muara Enim - Sumatera Selatan 31716
Tlp.+62734 453035 Fax. +62734 453039

Dipindai dengan CamScanner

REKAP VOLUME JOINT SURVEY SUBCONT - PT.AAP (SPPH 05852) VOLUME ANGKUTAN

BULAN		Total All Pit (OB)			
		SURVEY (Bcm)	RETASI (Bcm)	%	
2025					
	Desember	101,206.65	106,152.00	95.34%	Joint survey & Porsi
	TOTAL	101,206.65	106,152.00	95.34%	
2026	Januari	68,218.10	87,504.00	77.96%	Joint survey & Porsi
	Februari	20,007.86	25,440.00	78.65%	Porsi Joint survey (tanpa Non Volume)
	Maret	110,951.69	122,328.00	90.70%	Porsi Joint survey (tanpa Spoil/Non Volum
	April	110,308.07	118,248.00	93.29%	Porsi Joint survey (tanpa Spoil/Non Volum
	Mei	120,641.55	132,096.00	91.33%	Porsi Joint survey (OB + Bedding Coal)
	Juni	255,138.66	263,054.40	96.99%	Porsi Joint survey (OB + Lumpur)
	Juli			-	
	Agustus			-	
	September			-	
	Oktober			-	
	Nopember			-	
	Desember			-	
	TOTAL	685,265.92	748,670.40	91.53%	
KOMULATIF sd 2026		786,472.57	854,822.40	92.00%	

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA PROPORSIONAL JOINT SURVEY PEMINDAHAN TANAH
UNIT CATERPILAR HD773 PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
PERIODE : JUNI 2026
Nomor : ..... /SBS-BANKO/PM/..... /2026

Pada hari Ini Senin tanggal 13 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Tanjung Enim, dibuat Berita Acara Proporsional pemindahan tanah unit HD773 oleh dan antara :

1. **PT. SATRIA BAHANA SARANA**, Selaku pemberi tugas yang diwakili oleh Project Manager selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

   Dan

2. **PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA**, selaku pelaksana yang diwakili oleh Penanggung Jawab Operasional (PJO), Selanjutanya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berikut Perhitungan Proporsional Joint Survey unit HD773 :

Tabel 3. Perhitungan Joint Survey Volume Overburden

Loading	Dumping	Material	Ritase (Bcm)	(%)	Proporsional JS (Bcm)
BT-B PIT E SBS	DISPOSAL SEKATAN	CLAY	82,608.00	96.98%	80,114.79
BT-B PIT E SBS	RENCANA JALAN	CLAY	24,480.00	96.98%	23,741.16
BT-B PIT E SBS	RENCANA CSA	CLAY	456.00	96.98%	442.24
BT-B PIT E SBS	JALAN BARITO	CLAY	34,776.00	96.98%	33,726.42
BT-B PIT E SBS	SEKATAN	CLAY	114,024.00	96.98%	110,582.62
BT-B PIT E SBS	TS MAHONI	CLAY	1,584.00	96.98%	1,536.19
BT-B PIT E SBS	IPD WATERFILL	CLAY	3,960.00	96.98%	3,840.48
BT-B PIT E SBS	SEKATAN	LUMPUR	1,166.40	99.00%	1,154.75
Total			**263,054.40**		**255,138.66**

Berdasarkan hasil perhitungan proporsional diatas maka didapatkan volume keseluruhan yang dibayarkan yaitu sebesar : 255,138.66 BCM.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

ANDALAN

JONARISTON PASARIBU
PJO

PIHAK PERTAMA
PT. SATRIA BAHANA SARANA

Mining Solution

XAVERIUS TERRY THAROB
PROJECT MANAGER

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA KESEPAKATAN DATA UKUR HASIL JOINT SURVEY UNTUK PERHITUNGAN VOLUME MATERIAL OVERBURDEN LOKASI BANKO TENGAH BLOK B - PIT E

Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM telah disepakati proses data ukur lapangan untuk perhitungan volume joint survey lokasi BANKO TENGAH (PIT E), antara Data Survey Officer PT Satria Bahana Sarana, sebagai PIHAK PERTAMA dengan Surveyor PT Andalan Artha Primanusa sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA telah menyetujui dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil dari data ukur lapangan yang akan di proses untuk penghitungan volume joint survey lokasi PROJECT BANKO TENGAH (PIT E) 01 Juni s/d 30 Juni 2026. Data sebagai berikut:

NO	LOKASI	TANGGAL PENGUKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	BANKO TENGAH BLOK B - PIT E	13,28,30, Juni 2026	230/2.45 Ha	Original
2	BANKO TENGAH BLOK B - PIT E	3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22,23,24 ,26,27,28,29,30,Juni, 1 Juli	13354/75.81 Ha	Progress

Demikian Berita Acara kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan volume.

PIHAK PERTAMA
PT. SATRIA BAHANA SARANA
Data Survey Officer

M. DELLI MAULANA

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
Surveyor

ADHE WAHYU ALSANDI

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
PT. SATRIA BAHANA SARANA
SPV. Data Survey

M. Dwi Juliandi

PIHAK KEDUA
PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
MCC Engineer

Igo Satriya

Dipindai dengan CamScanner

	TATA LAKSANA **MINE SURVEY**	No. Dok : 2 No. : 1
	ROUTING SLIP BERITA ACARA PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERHITUNGAN KUANTITAS LAHAN	Halaman : 3 dari 7

KONTRAKTOR : PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
LOKASI GALIAN : BANKO TENGAH PIT E
PROGRESS KE : VII (KE TUJUH)
PERIODE : 01 JUNI s/d 30 JUNI 2026

NO	KEGIATAN	OLEH	TANGGAL		JABATAN	STATUS	PARAF	KETERANGAN
1	**PENGUKURAN JOINT SURVEY** (Pengambilan Data Ukur Lapangan)	PT. SBS	3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22,23,24,26, 27,28,29,30,Juni, 1 Juli	Deprianto L.	SPV. Survey Tambang			
		PT. AAP		Adhe Wahyu Alsandi	Surveyor			
2	**PENGOLAHAN DATA** (Transfer Raw Data, Cek Raw Data, Olah Data, Check Hasil Dengan Sekuen, Luas Dan Volume)	PT. SBS	3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22,23,24,26, 27,28,29,30,Juni, 1 Juli	M. Delli Maulana	Data Survey Officer			
		PT. AAP		Adhe Wahyu Alsandi	Surveyor			
3	**PERHITUNGAN ADJUSMENT VOLUME** (Cek, Input Hasil Olah Data Dan Pelaporan)	PT. SBS	03 Juli 2026	M. Dwi Juliandi	SPV. Data Survey			
		PT. AAP		Adhe Wahyu Alsandi	Surveyor			
4	**HASIL PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN LAHAN** (Pembuatan, Pengecekan Dan Penandatanganan	PT. AAP	JULI 2026	Adhe Wahyu Alsandi	Surveyor			
		PT. AAP	JULI 2026	Igo Satriya	MCC Engineer			
		PT. AAP	JULI 2026	Jonariston Pasaribu	PJO			
		PT. SBS	17 JULI 2026	Deprianto L.	SPV. Survey Tambang			
		PT. SBS	17 JULI 2026	M. Dwi Juliandi	SPV. Data Survey			
		PT. SBS	20 JULI 2026	Eko Setiawan	Asisten Manajer Survey Tambang			
		PT. SBS	21 JULI 2026	Mamat Rachmat	Manajer Perencanaan Tambang			
		PT. SBS	21 JULI 2026	Tanrin Toni	Senior Manajer Produksi			
		PT. SBS	JULI 2026	Xaverius Ferry Tharob	Project Manager			

Dipindai dengan CamScanner

	TATA LAKSANA MINE SURVEY HASIL PERHITUNGAN PROGRES	No. Dok : 2 No. Revisi : 1 Halaman : 2 dari 7

KONTRAKTOR : PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
LOKASI GALIAN : BANKO TENGAH PIT E. MATERIAL COMMON SOIL
PROGRESS KE : VII (KE TUJUH)
PERIODE : 01 JUNI s/d 30 JUNI 2026

NO	KEGIATAN	OLEH	TANGGAL	KETERANGAN
1	JOINT SURVEY ORIGINAL GROUND (Dasar Progress)	PT.SBS + PT.AAP	12,13,14,16,24,Jan, Feb, April,Mei, 1,2,3,4,5,6,7,9,11,16,17,19,20,23,27,30 Juni 2026	
2	TRANSFER DATA JOINT SURVEY ORIG KE KOMPUTER	PT.SBS + PT.AAP	12,13,14,16,24,Jan, Feb, April,Mei, 1,2,3,4,5,6,7,9,11,16,17,19,20,23,27,30 Juni 2026	
3	PENGECEKAN FILE DATA JOINT SURVEY ORIGINAL GROUND (Dasar Progress)	PT.SBS + PT.AAP	12,13,14,16,24,Jan, Feb, April,Mei, 1,2,3,4,5,6,7,9,11,16,17,19,20,23,27,30 Juni 2026	
4	MENGGAMBAR MUKA TANAH RENCANA	PT.SBS + PT.AAP	03 Juli 2026	
5	JOINT SURVEY PROGRESS	PT.SBS + PT.AAP	3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22,23,24, 26,27,28,29,30,Juni, 1 Juli	
6	TRANSFER DATA JOINT SURVEY PROGRESS KE KOMPUTER	PT.SBS + PT.AAP	02 Juli 2026	
7	PENGOLAHAN DATA JOINT SURVEY PROGRESS DI KOMPUTER	PT.SBS + PT.AAP	02 Juli 2026	
8	PENGGABUNGAN DATA ORIGINAL DENGAN PROGRESS	PT.SBS + PT.AAP	02 Juli 2026	
9	PENGHITUNGAN VOLUME (BCM)	PT.SBS + PT.AAP	03 Juli 2026	
10	PERSETUJUAN HASIL PERHITUNGAN KUANTITAS (BCM)	PT.SBS + PT.AAP	03 Juli 2026	

TOTAL VOLUME HASIL GALIAN TANAH (COMMON SOIL) PROGRES KE VII (KE TUJUH) : 253.983,91 Bcm

Terbilang:# Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Sembilan Satu . Bcm #

Tanjung Enim, ... 2026

PT . ANDALAN ARTHA PRIMANUSA		PT . SATRIA BAHANA SARANA
Jonariston Pasaribu PJO	Tanrin Toni SM. Produksi	Kaverius Ferry Tharob Project Manager

Dipindai dengan CamScanner

	TATA LAKSANA **MINE SURVEY**	No. Dok : 2
	HASIL PERHITUNGAN PROGRES	No. Revisi : 1 Halaman : 2 dari 7

KONTRAKTOR : PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
LOKASI GALIAN : BANKO TENGAH PIT E. MATERIAL LUMPUR
PROGRESS KE : VII (KE TUJUH)
PERIODE : 01 JUNI s/d 30 JUNI 2026

NO	KEGIATAN	OLEH	TANGGAL	KETERANGAN
1	JOINT SURVEY ORIGINAL GROUND (Dasar Progres)	PT.SBS + PT.AAP	12,13,14,16,24,Jan, Feb, April,Mei, 1,2,3,4,5,6,7,9,11,16,17,19,20,23,27,30 Juni 2026	
2	TRANSFER DATA JOINT SURVEY ORIG KE KOMPUTER	PT.SBS + PT.AAP	12,13,14,16,24,Jan, Feb, April,Mei, 1,2,3,4,5,6,7,9,11,16,17,19,20,23,27,30 Juni 2026	
3	PENGECEKAN FILE DATA JOINT SURVEY ORIGINAL GROUND (Dasar Progress)	PT.SBS + PT.AAP	12,13,14,16,24,Jan, Feb, April,Mei, 1,2,3,4,5,6,7,9,11,16,17,19,20,23,27,30 Juni 2026	
4	MENGGAMBAR MUKA TANAH RENCANA	PT.SBS + PT.AAP	03 Juli 2026	
5	JOINT SURVEY PROGRESS	PT.SBS + PT.AAP	3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22,23,24, 26,27,28,29,30,Juni, 1 Juli	
6	TRANSFER DATA JOINT SURVEY PROGRESS KE KOMPUTER	PT.SBS + PT.AAP	02 Juli 2026	
7	PENGOLAHAN DATA JOINT SURVEY PROGRESS DI KOMPUTER	PT.SBS + PT.AAP	02 Juli 2026	
8	PENGGABUNGAN DATA ORIGINAL DENGAN PROGRESS	PT.SBS + PT.AAP	02 Juli 2026	
9	PENGHITUNGAN VOLUME (BCM)	PT.SBS + PT.AAP	03 Juli 2026	
10	PERSETUJUAN HASIL PERHITUNGAN KUANTITAS (BCM)	PT.SBS + PT.AAP	03 Juli 2026	

TOTAL VOLUME HASIL GALIAN LUMPUR PROGRES KE VII (KE TUJUH) : **1.154,75 Bcm**

Terbilang : # Seribu Seratus Lima Puluh Empat Koma Tujuh Lima. BCM #

Tanjung Enim, ... 2026

PT . ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Jonariston Pasaribu
PJO

Tanjin Toni
SMK Produksi

PT . SATRIA BAHANA SARANA

Xaverius Ferry Tharob
Project Manajer

Dipindai dengan CamScanner

	TATA LAKSANA MINE SURVEY HASIL PERHITUNGAN PROGRESS	No. Dok : 2 No. Revisi : 0 Halaman : 1 dari 7

HASIL PERHITUNGAN PROGRES KE VII (KE TUJUH) BULAN JUNI 2026
Lokasi : BANKO TENGAH PIT E. MATERIAL COMMON SOIL
Periode : 01 JUNI s/d 30 JUNI 2026

Volume Progress Galian Progres Ke VII (Tujuh) Periode Juni 2026 : 255.138,66 Bcm
Volume Galian Lumpur Progres ke VII (Tujuh) Periode Juni 2026 : 1.154,75 Bcm
Volume Progress galian Common Soil Progres Ke VII (Tujuh) periode Juni 2026 : 253.983,91 Bcm

Dihitung oleh :

I. PT. Satria Bahana Sarana

1. Asisten Manajer Survey Tambang : Eko Setiawan 20/07/2026

2. Manajer Perencanaan Tambang : Mamat Rachmat 21/07/2026

II. PT. Andalan Artha Primanusa

1. Surveyor : Adhe Wahyu Alsandi 19/07/2026

2. PJO : Johariston Pasaribu 19/07/2026

Dipindai dengan CamScanner

HASIL PERHITUNGAN PROGRES KE VII (KE TUJUH) BULAN JUNI 2026
Lokasi : BANKO TENGAH PIT E. MATERIAL LUMPUR
Periode : 01 JUNI s/d 30 JUNI 2026

Volume Lumpur Progres Ke VII (Tujuh) Periode Juni 2026 : **1.154,75** Bcm

Dihitung oleh :

I. PT. Satria Bahana Sarana

1. Asisten Manajer Survey Tambang : Eko Setiawan ...../ 09/2026


2. Manajer Perencanaan Tambang : Mamat Rachmat ...../ 09/2026

II. PT. Andalan Artha Primanusa

1. Surveyor : Adhe Wahyu Alsandi ...../ 09/2026

2. PJO : Jonariston Pasaribu ...../ 09/2026

Dipindai dengan CamScanner

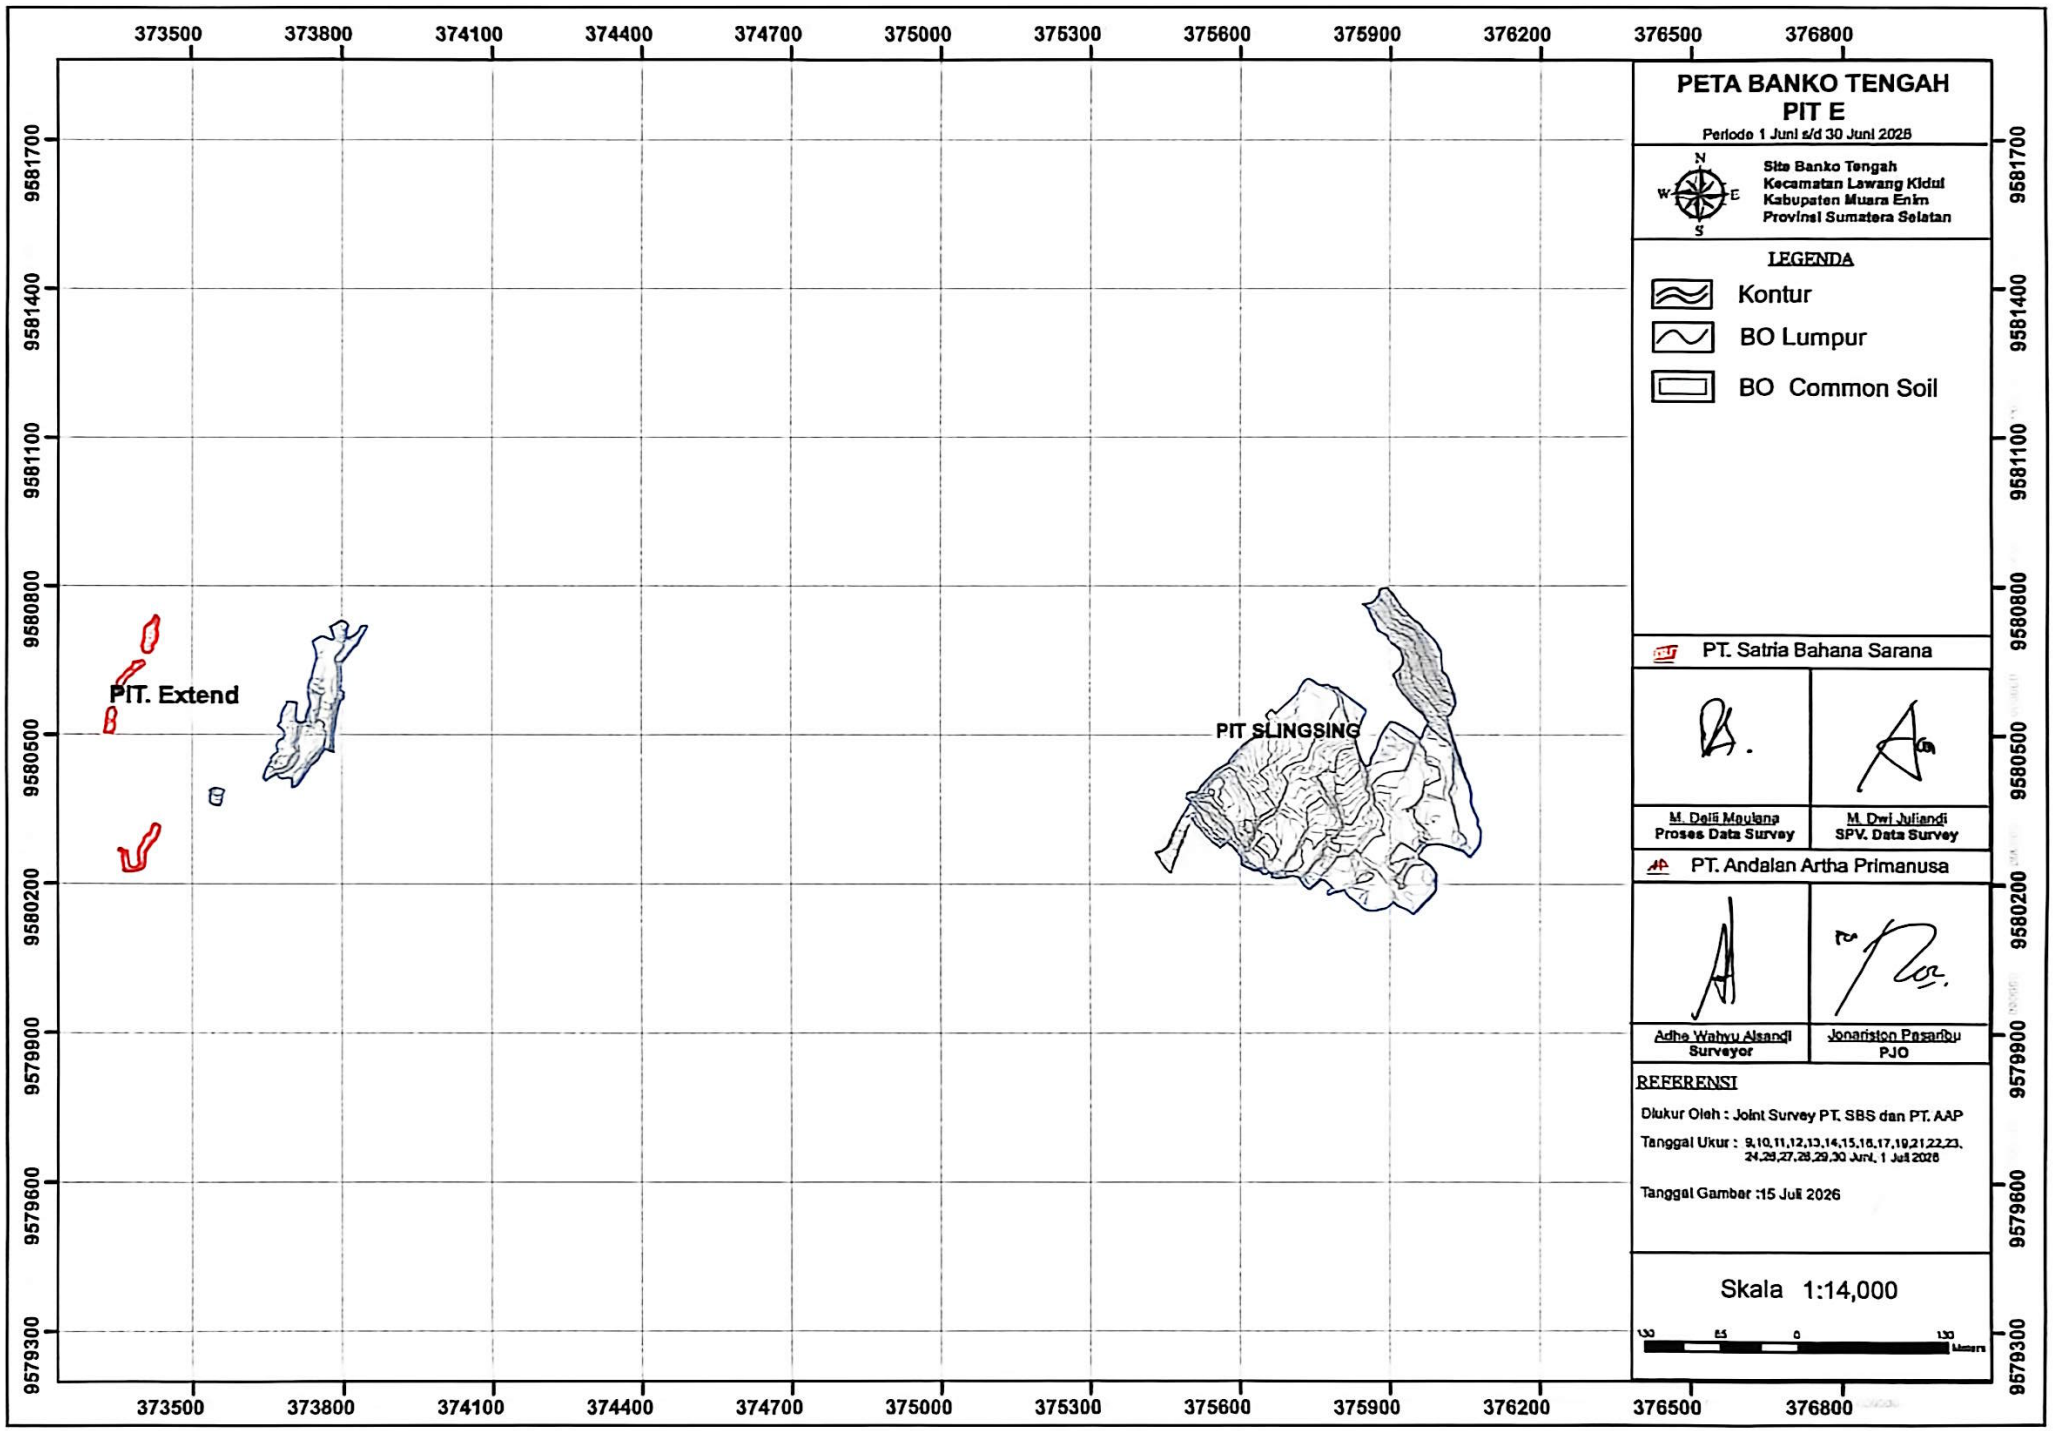

Dipindai dengan CamScanner
