PT. BUDI GEMA GEMPITA

Wisma Budi Lantai 8 & 9 Jln HR. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta 12940 (Tlp.021-5213383)

Berita Acara Pemindahan Over Burden

Nomor: SRV-OB/BGG/06/06/26

Pada hari ini Rabu, Tanggal 01 Bulan Juli Tahun 2026 telah selesai dilakukan perhitungan Joint Survey lokasi penambangan batubara Kontraktor PT. Andalan Artha Primanusa di Pit Kungkilan dalam IUP Operasi Produksi PT. Budi Gema Gempita, dengan hasil :

1. Pengukuran didasarkan atas perhitungan Cut & Fill.
2. Topografi awal (Original topo) menggunakan pengukuran joint survey update pada Oktober 2025.
3. Topografi penggalian (Cut) dan penimbunan (Fill) menggunakan pengukuran joint survey pada tanggal 30 Juni 2026.
4. Sistem penghitungan menggunakan **Year to date** dengan rumus penghitungan (Volume update hasil pengukuran – Volume bulan – bulan sebelumnya).
5. Perhitungan cut & fill kedua topografi di atas (point 2 dan 3) dilakukan oleh PT. AAP dan PT. BGG dengan hasil seperti terlampir pada lampiran 1 berita acara ini.
6. Hasil pengukuran kedua belah pihak masih memiliki perbedaan, namun masih dibawah ambang batas 2% (hasilnya 0,18 %).
7. Kesepakatan perhitungan Cut & Fill antara kedua belah pihak adalah: **247,557.933** Bcm.
8. Hasil perhitungan dalam berita acara ini merupakan perhitungan kegiatan. Penambangan (pengupasan OB dan Batubara) dari periode awal Juni hingga akhir bulan Juni 2026.
9. Jarak angkut dari Pit PT. AAP ke Stockpile PT. BGG sepanjang 4,000 – 4,700 Meter.
10. Jarak buang OB ke Disposal Area PT. BGG sepanjang antara 100 Meter sampai dengan 3,400 Meter dengan Volume **210,211.149** BCM.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 01 Juli 2026

1. Pihak PT. BGG

Diketahui,	Disetujui oleh,		Disiapkan oleh,
M. Idris E. K. Ode	**Mahbub Junaedi**	**Sony Darmawan**	**DN. Wilopo**
KTT	Kabag. Produksi	Kabag. Engineering	Surveyor

2. Pihak PT. AAP

Diketahui oleh,	Disetujui oleh,	Disiapkan oleh,
Eko Guswandono	**Alexander Galingging**	**Agus Prasetyo**
PJO	Kabag Eng&Prod	Surveyor

PT. BUDI GEMA GEMPITA

Wisma Budi Lantai 8 & 9 Jln HR. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta 12940 (Tlp.021-5213383)

Berita Acara Kesepakatan Perhitungan

Berdasarkan perhitungan bersama dari joint survey pada tanggal 01 Juli 2026 dan telah dilakukan perhitungan dengan hasil :

- Pihak PT. BGG = **247,340.154** Bcm
- Pihak PT. AAP = **247,775.712** Bcm

Oleh karena selisih perhitungan = **435.558** Bcm (**0,18%**) dari total keseluruhan over burden terbongkar, maka hasil perhitungan over burden terbongkar dirata-ratakan menjadi.

$$\frac{(247{,}340.154 + 247{,}775.713)}{2} = 247{,}557.933 \text{ Bcm.}$$

Maka didapat volume Over Burden yang dipindahkan sebanyak **210,211.149** Bcm dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Volume OB + Coal Terbongkar (BCM)	Volume Batubara (BCM)	Volume OB (BCM)
a	*b*	*c*	*d = b – c*
1	**247,557.933**	**37,346.784**	**210,211.149**

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat untuk diketahui adanya.

Lahat, 01 Juli 2026

1. Pihak PT. BGG

Disiapkan oleh,

DN. Wilopo
Surveyor

2. Pihak PT. AAP

Disiapkan oleh,

Agus Prasetyo
Surveyor

PT. BUDI GEMA GEMPITA

Wisma Budi Lantai 8 & 9 Jln HR. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta 12940 (Tlp.021-5213383)

ANDALAN

BERITA ACARA
INVENTORY BATUBARA

Nomor : SRV-IB/BGG/06/06/26

Pada hari ini Tanggal 1 Bulan Juli Tahun 2026, telah selesai dilakukan penghitungan Inventory Batubara Seam 8 di Awal Bulan Juni 2026 pada lokasi kerja kontraktor PT. Andalan Artha Primanusa di dalam IUP Operasi Produksi PT. Budi Gema Gempita dengan hasil:

1. Inventory Seam 8 Barat dari hasil perhitungan : 16,560.00 Mt

Total seluruh inventory Awal bulan Juli 2026 pada Pit Kungkilan lokasi kerja kontraktor PT. Andalan Artha Primanusa adalah : 16,560.00 Mt

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 01 Juli 2026

1. Pihak PT. BUDI GEMA GEMPITA

Diketahui oleh,	Disetujui oleh,		Disiapkan oleh,
M. Idris. E. K. Ode	**Mahbub Junaedi**	**Sony Darmawan**	**DN. Wilopo**
KTT	Kabag Produksi	Kabag Engineering	Surveyor

2. Pihak PT. ANDALAN ARTHA PRIMANUSA

Diketahui oleh,	Disetujui oleh,	Disiapkan oleh,
Eko Guswandono	**Alexander Galingging**	**Agus Prasetyo**
PJO	Kabag Engineering	Surveyor

PT. BUDI GEMA GEMPITA

Wisma Budi Lantai 8 & 9 Jln HR. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta 12940 (Tlp.021-5213383)

ANDALAN

Berita Acara Pending Volume Overburden Periode Juni 2026

Nomor: SRV-OB/BGG/06/06/26

Pada hari ini Rabu, Tanggal 1 Juli tahun 2026 dengan mempertimbangkan :

1. Berita Acara pemindahan Overburden periode Bulan Juni 2026 antara PT. Budi Gema Gempita dengan PT. Andalan Artha Primanusa Nomor : SRV-OB/BGG/06/06/26
2. Berdasarkan MoM hasil meeting HO dengan nomor surat : MoM-HO-Meeting-7-X-2025 pada tanggal 29 Oktober 2025 pada poin 2.5, bahwasannya produksi Overburden di Bulan November & Desember 2025 menggunakan Budget Annual 2026, maka Volume Overburden akan ditagihkan pada tahun 2026.
3. Total Volume OB Joint Survey pada periode Juni adalah **161.986,660 BCM**, dengan total Volume OB Invoice adalah **210.211,149 BCM.**
4. Berita Acara Pending Volume ini dibuat bukan sebagai Berita Acara Penagihan Volume.

Mengacu pada produksi Overburden oleh PT. Andalan Artha Primanusa pada periode Juni 2026, maka disepakati tidak ada Remain Pending Volume OB bulan berikutnya. dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Invoice Volume CG (MT)	Pending OB Volume (BCM)	Cumm. Pending OB Volume (BCM)
Nov-25	58,061.07	413,200.03	413,200.03
Dec-25	22,668.15	281,389.25	694,589.29
Jan-26	16,858.73	64,511.84	759,101.13
Feb-26	1,353.51	220,868.01	979,969.13
Mar-26	39,734.33	(560,194.54)	419,774.60
Apr-26	33,089.86	(104,205.64)	315,568.96
May-26	52,036.82	(267,344.48)	48,224.49
Jun-26	46,683.48	(48,224.49)	(0.00)
Total	**270,485.95**	**(0.00)**	

Lahat, 01 Juli 2026

1. Pihak PT. BGG

Disiapkan oleh,

DN Wilopo

Surveyor

2. Pihak PT. AAP

Disiapkan oleh,

Agus Prasetyo

Surveyor

PT. BUDI GEMA GEMPITA

Wisma Budi Lt.8-9 Jl.HR.Rasuna Said Kav.C-6
Jakarta Selatan 12940 Telp.: (021) 5213383

Berita Acara Perhitungan Batubara Akhir Bulan

Nomor : 025-BB-KKL/AAP/VI/26

Pada hari ini, Selasa , Tanggal 30 Bulan Juni Tahun 2026, telah selesai dilakukan perhitungan batubara, dari lokasi Front ke areal Stockpile oleh Kontraktor PT. Andalan Artha Primanusa di Pit Kungkilan dalam IUP Operasi Produksi PT. Budi Gema Gempita, terhitung dari tanggal 1 s/d 30 Juni 2026 dengan hasil sebagai berikut :

No	Seam	Produksi Batubara (Ton)		
		Bulan Juni	Akumulasi sampai Mei	Akumulasi sampai Juni
a	**b**	**c**	**d**	**e (c+d)**
1	8	46.683,480	1.708.104,380	1.754.787,860
2	9	-	-	-
3	10	-	-	-
Total		**46.683,480**	**1.708.104,380**	**1.754.787,860**

Demikian berita acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 30 Juni 2026

1. Pihak PT. BGG

Diketahui oleh,	Disetujui oleh,		Disiapkan oleh,
PT. BUDI GEMA GEMPITA			
M. Idris E.K. Ode	**Mahbub Junaedi**	**Sony Darmawan**	**Rianto Lim**
KTT	Kabag. Produksi	Kabag. Engineering	Adm

2. Pihak PT. AAP

Diketahui oleh,	Disetujui oleh,	Disiapkan oleh,
Eko Guswandono	**Alexander Galingging**	**Dhini Andini**
PJO	Kabag. Eng & Produksi	Adm

REKAPITULASI

PRODUKSI BATU BARA PIT. AAP (KUNGKILAN)

STOCKPILE PT. BGG

Periode : 1 - 30 Juni 2026

NO	TANGGAL	RITASE	TONASE (TON)				JUMLAH	KETERANGAN
			SEAM					
			7	8	9	10		
1	01/06/2026	131	-	3.542.570	-	-	3.542.570	
2	02/06/2026	105	-	2.520.030	-	-	2.520.030	
3	03/06/2026	100	-	2.436.740	-	-	2.436.740	
4	04/06/2026	90	-	2.077.530	-	-	2.077.530	
5	05/06/2026	70	-	1.561.930	-	-	1.561.930	
6	06/06/2026	77	-	1.727.920	-	-	1.727.920	
7	07/06/2026	52	-	1.182.250	-	-	1.182.250	
8	08/06/2026	27	-	579.760	-	-	579.760	
9	09/06/2026	63	-	1.357.630	-	-	1.357.630	
10	10/06/2026	37	-	895.910	-	-	895.910	
11	11/06/2026	107	-	2.513.910	-	-	2.513.910	
12	12/06/2026	94	-	2.280.720	-	-	2.280.720	
13	13/06/2026	103	-	2.412.100	-	-	2.412.100	
14	14/06/2026	76	-	1.774.900	-	-	1.774.900	
15	15/06/2026	17	-	387.320	-	-	387.320	
16	16/06/2026	81	-	1.842.750	-	-	1.842.750	
17	17/06/2026	51	-	1.192.970	-	-	1.192.970	
18	18/06/2026	99	-	2.358.180	-	-	2.358.180	
19	19/06/2026	94	-	2.261.740	-	-	2.261.740	
20	20/06/2026	66	-	1.598.830	-	-	1.598.830	
21	21/06/2026	77	-	1.911.290	-	-	1.911.290	
22	22/06/2026	37	-	844.590	-	-	844.590	
23	23/06/2026	28	-	643.970	-	-	643.970	
24	24/06/2026	-	-	-	-	-	-	
25	25/06/2026	-	-	-	-	-	-	
26	26/06/2026	-	-	-	-	-	-	
27	27/06/2026	44	-	1.005.170	-	-	1.005.170	
28	28/06/2026	98	-	2.209.900	-	-	2.209.900	
29	29/06/2026	98	-	2.289.180	-	-	2.289.180	
30	30/06/2026	54	-	1.273.690	-	-	1.273.690	
TOTAL		**1.976**	**-**	**46.683.480**	**-**	**-**	**46.683.480**	

Lahat, 30 Juni 2026

1. Pihak PT. BGG

Diketahui Oleh,		Disetujui Oleh,		Disiapkan Oleh,
PT. BUDI GEMA GEMPITA				
M. Idris E.K. Ode	**Mahbub Junaedi**		**Sony Darmawan**	**Rianto Lim**
KTT	Kabag. Produksi		Kabag. Engineering	Adm

2. Pihak PT. AAP

Diketahui Oleh,		Disetujui Oleh,	Disiapkan Oleh,
Eko Guswandono		**Alexander Galingging**	**Dhini Andini**
PJO		Kabag. Eng & Produksi	Adm

PT. BUDI GEMA GEMPITA

Wisma Budi Lantai 8 & 9 Jln HR. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta 12940 (Tlp.021-5213383)

BAP NO : 25/BAP-AAP-KKL/VI/26
MONTH OF : Juni 2026
OWNER : PT. BGG
CONTRACTOR : PT. AAP
CONTRACT REF :
SCOPE OF WORK : MINING WORKS
PRODUCT PERIODE : 1 - 30 Juni 2026

Item	DESCRIPTION		UNIT	PRODUCT for the previous month	Total Volume product up to the last month	Total volume executed up to this period	Progress volume for this month
				a	b	c = b + d	d
1	Overburden removal work						
	Excavete,haul,dump and spread (<1 Km)						
	BLOK	PIT					
1,1	KUNGKILAN	KUNGKILAN	Bcm	588.536,434	9.009.025,552	9.219.236,701	210.211,149
	Total -1			**588.536,434**	**9.009.025,552**	**9.219.236,701**	**210.211,149**
2	Coal mined						
	Extraction,load						
	PIT	SEAM					
	KUNGKILAN	8	Tons	52.036,820	1.708.104,380	1.754.787,860	46.683,480
		9	Tons	0,000	0,000	0,000	0,000
		10	Tons	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total -2			**52.036,820**	**1.708.104,380**	**1.754.787,860**	**46.683,480**
	Stripping Ratio Pit 1 :			**11,31**	**5,27**	**5,25**	**4,50**
3	**Adjusment of Haul Distance**						
3,1	Overburden removal-Refer attachment No.1						
3,2	coal Extraction-rever attachment No.2						
	Total						

Lahat, 30 Juni 2026

1. PT.BGG

Checked by,

PT. BUDI GEMA GEMPITA

M. Idris E.K. Ode
KTT

Mahbub Junaedi
Kabag. Produksi

Verified by

Sony Darmawan
Kabag. Engineering

Prepared by,

DN. Wilopo
Surveyor

Rianto Lim
Adm

2. PT.AAP

Checked by,

Eko Guswandono
PJO

Verified by

Alexander Calingging
Kabag. Eng & Produksi

Prepared by,

Dhini Andini
Adm

ANDALAN

Berita Acara Pemindahan Over Burden Pit Kungkilan

Pada tanggal 01 Bulan Juli Tahun 2026 telah selesai dilakukan perhitungan Joint Survey lokasi penambangan batubara Kontraktor PT. Andalan Artha Primanusa dengan Volume **161,986.660 BCM** dan *sumproduct distance* **1,165.805** Meter, sedangkan sumproduct distance untuk invoice (min distance 1000 meter) adalah **1,238.526** Meter, adapun rincian volume OB untuk masing-masing jarak buang OB ke Disposal sebagai berikut:

NO	DISTANCE (Meter)	VOLUME (BCM)	OB X DISTANCE	DISTANCE (Meter)	VOLUME (BCM)	OB X DISTANCE	LOADING POINT	DUMPING POINT
1	100.0	3,568.240	356,824.000	1,000	3,568.240	3,568,240.000	KKL	Embankment
2	200.0	6,967.280	1,393,456.000	1,000	6,967.280	6,967,280.000	KKL	Embankment
3	400.0	3,231.720	1,292,688.000	1,000	3,231.720	3,231,720.000	KKL	Embankment
4	900.0	892.000	802,800.000	1,000	892.000	892,000.000	KKL	Seam 8
5	900.0	9,664.000	8,697,600.000	1,000	9,664.000	9,664,000.000	KKL	Disposal Section 2
6	1,000.0	6,033.000	6,033,000.000	1,000	6,033.000	6,033,000.000	KKL	Embankment
7	1,000.0	9,932.000	9,932,000.000	1,000	9,932.000	9,932,000.000	KKL	Disposal Section 2
8	1,100.0	22.000	24,200.000	1,100	22.000	24,200.000	KKL	Seam 8
9	1,100.0	18,637.000	20,500,700.000	1,100	18,637.000	20,500,700.000	KKL	Embankment
10	1,200.0	51.000	61,200.000	1,200	51.000	61,200.000	KKL	Seam 8
11	1,200.0	5,024.051	6,028,861.200	1,200	5,024.051	6,028,861.200	KKL	Disposal Section 2
12	1,200.0	24,717.669	29,661,202.800	1,200	24,717.669	29,661,202.800	KKL	Embankment
13	1,300.0	1,030.000	1,339,000.000	1,300	1,030.000	1,339,000.000	KKL	Seam 8
14	1,300.0	1,040.000	1,352,000.000	1,300	1,040.000	1,352,000.000	KKL	Disposal Section 2
15	1,300.0	1,650.000	2,145,000.000	1,300	1,650.000	2,145,000.000	KKL	Embankment
16	1,400.0	4,226.000	5,916,400.000	1,400	4,226.000	5,916,400.000	KKL	Disposal Section 2
17	1,400.0	52,408.000	73,371,200.000	1,400	52,408.000	73,371,200.000	KKL	Embankment
18	1,500.0	7,527.960	11,291,940.000	1,500	7,527.960	11,291,940.000	KKL	Disposal Section 2
19	1,600.0	5,330.740	8,529,184.000	1,600	5,330.740	8,529,184.000	KKL	Disposal Section 2
20	3,400.0	34.000	115,600.000	3,400	34.000	115,600.000	KKL	Temporary
TOTAL		**161,986.660**	**188,844,856.000**		**161,986.660**	**200,624,728.000**		
Sumproduct	**1,165.805**	**Meter**		**1,238.526**	**Meter**			

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya terimakasih.

1. Pihak PT. AAP

Diketahui Oleh,	Disetujui Oleh	Disiapkan Oleh
Eko Guswandono	**Alexander Galingging**	**Dhini Andhini**
PJO	Kabag. Eng&Prod	Adm

2. Pihak PT. BGG

Diketahui Oleh,	Disetujui Oleh,		Disiapkan Oleh,
PT. BUDI GEMA GEMPITA			
M. Idris E.K. Ode	**Mahbub Junaedi**	**Sony Darmawan**	**Rianto Lim**
KTT	Kabag. Produksi	Kabag. Engineering	Adm

ANDALAN

Berita Acara Pemindahan Batubara Pit Kungkilan

Pada tanggal 01 Juli Tahun 2026 telah selesai dilakukan perhitungan Joint Survey lokasi penambangan batubara Kontraktor PT. Andalan Artha Primanusa dengan Volume **46,683.480 Mton** dan *sumproduct* jarak **4,581.770 Meter,** adapun rincian volume batubara untuk masing-masing jarak hauling batubara ke Stockpile sebagai berikut:

NO	DISTANCE (Meter)	VOLUME (MT)	VOL X DISTANCE	LOADING POINT	DUMPING POINT
1	4,000	5,772.770	23,091,080.000	KKL	Hopper
2	4,200	2,755.880	11,574,696.000	KKL	ROM A
3	4,600	1,005.170	4,623,782.000	KKL	ROM A
4	4,700	37,149.660	174,603,402.000	KKL	ROM A
TOTAL		**46,683.480**	**213,892,960.000**		
Sumproduct	**4,581.770**	**Meter**			

Demikian berita acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


1. Pihak PT. AAP

Diketahui Oleh,	Disetujui Oleh,	Disiapkan Oleh
Eko Guswandono	**Alexander Galingging**	**Dhini Andhini**
PJO	Kabag. Eng&Prod	Adm

2. Pihak PT. BGG

Diketahui Oleh,	Disetujui Oleh,		Disiapkan Oleh,
PT. BUDI GEMAGEMPITA			
M. Idris E.K. Ode	**Mahbub Junaedi**	**Sony Darmawan**	**Rianto Lim**
KTT	Kabag. Produksi	Kabag. Engineering	Adm

PT. Andalan Artha Primanusa
Jl. Plaju No.11 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 DKI Jakarta – Indonesia
Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com | www.andalan-nusantara.com

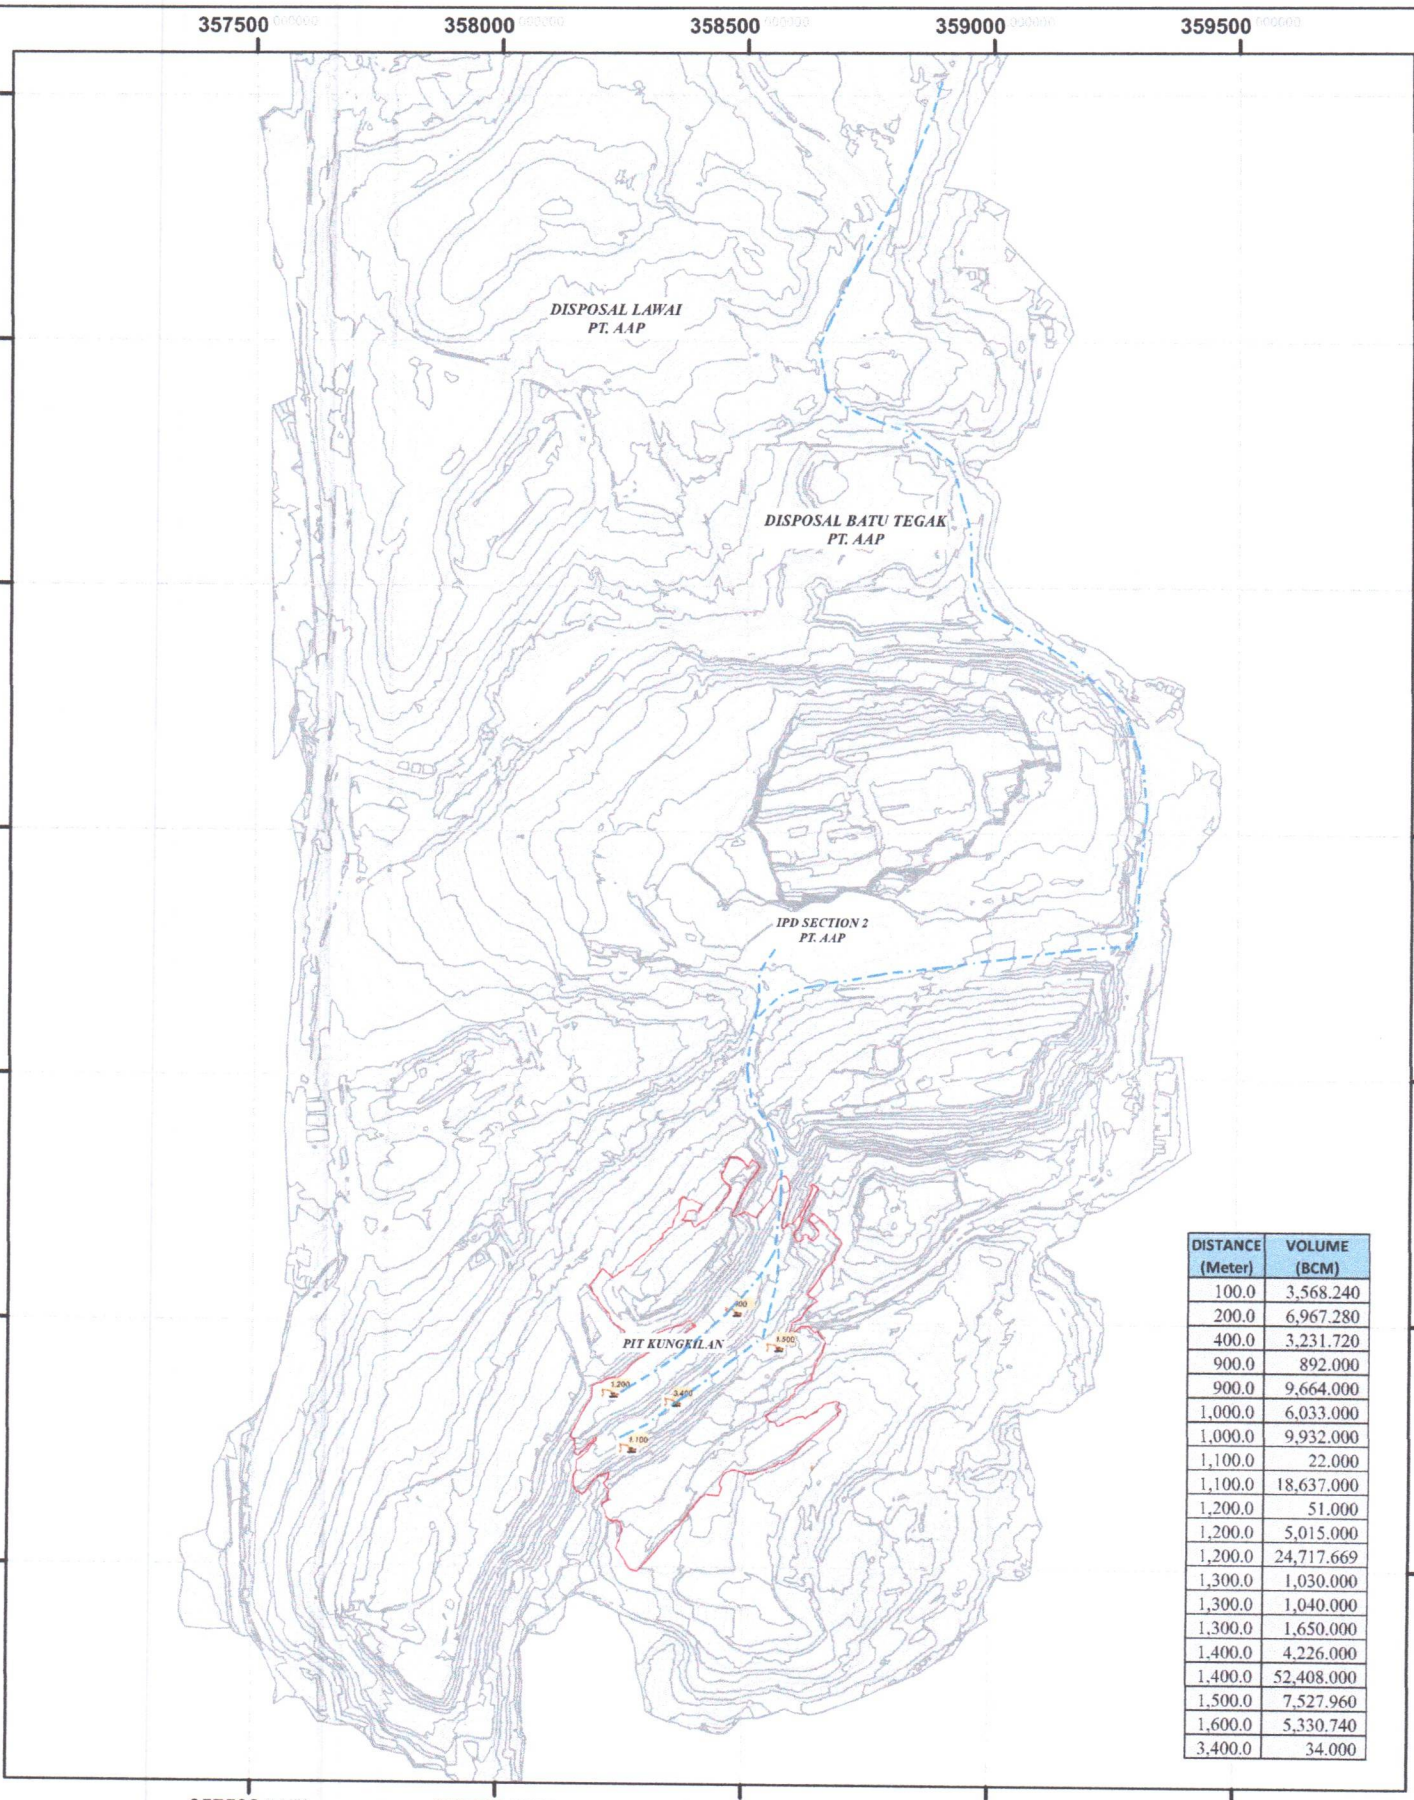

DISTANCE (Meter)	VOLUME (BCM)
100.0	3,568.240
200.0	6,967.280
400.0	3,231.720
900.0	892.000
900.0	9,664.000
1,000.0	6,033.000
1,000.0	9,932.000
1,100.0	22.000
1,100.0	18,637.000
1,200.0	51.000
1,200.0	5,015.000
1,200.0	24,717.669
1,300.0	1,030.000
1,300.0	1,040.000
1,300.0	1,650.000
1,400.0	4,226.000
1,400.0	52,408.000
1,500.0	7,527.960
1,600.0	5,330.740
3,400.0	34.000

PETA DISTANCE TAMBANG
JUNI 2026

N

1:15,000

300 150 0 300 Meters

VOLUME CUT OFF
Pit Kungkilan


OB	210,211.149 Bcm
COAL	46,683.480 Mt
SR	4.50

Catatan
Jarak Hauling Dari Pit Area - Stockpile : 4,000 - 4,700 meter
Jarak Buang OB Dari Pit Area - Disposal : 100 - 3,400 meter

Legenda :

- Boundary kkl
- Countur Mayor
- Countur Minor

PT. AAP		
Dibuat	Diketahui	Disetujui
PT. BGG		
Dibuat	Diketahui	Disetujui

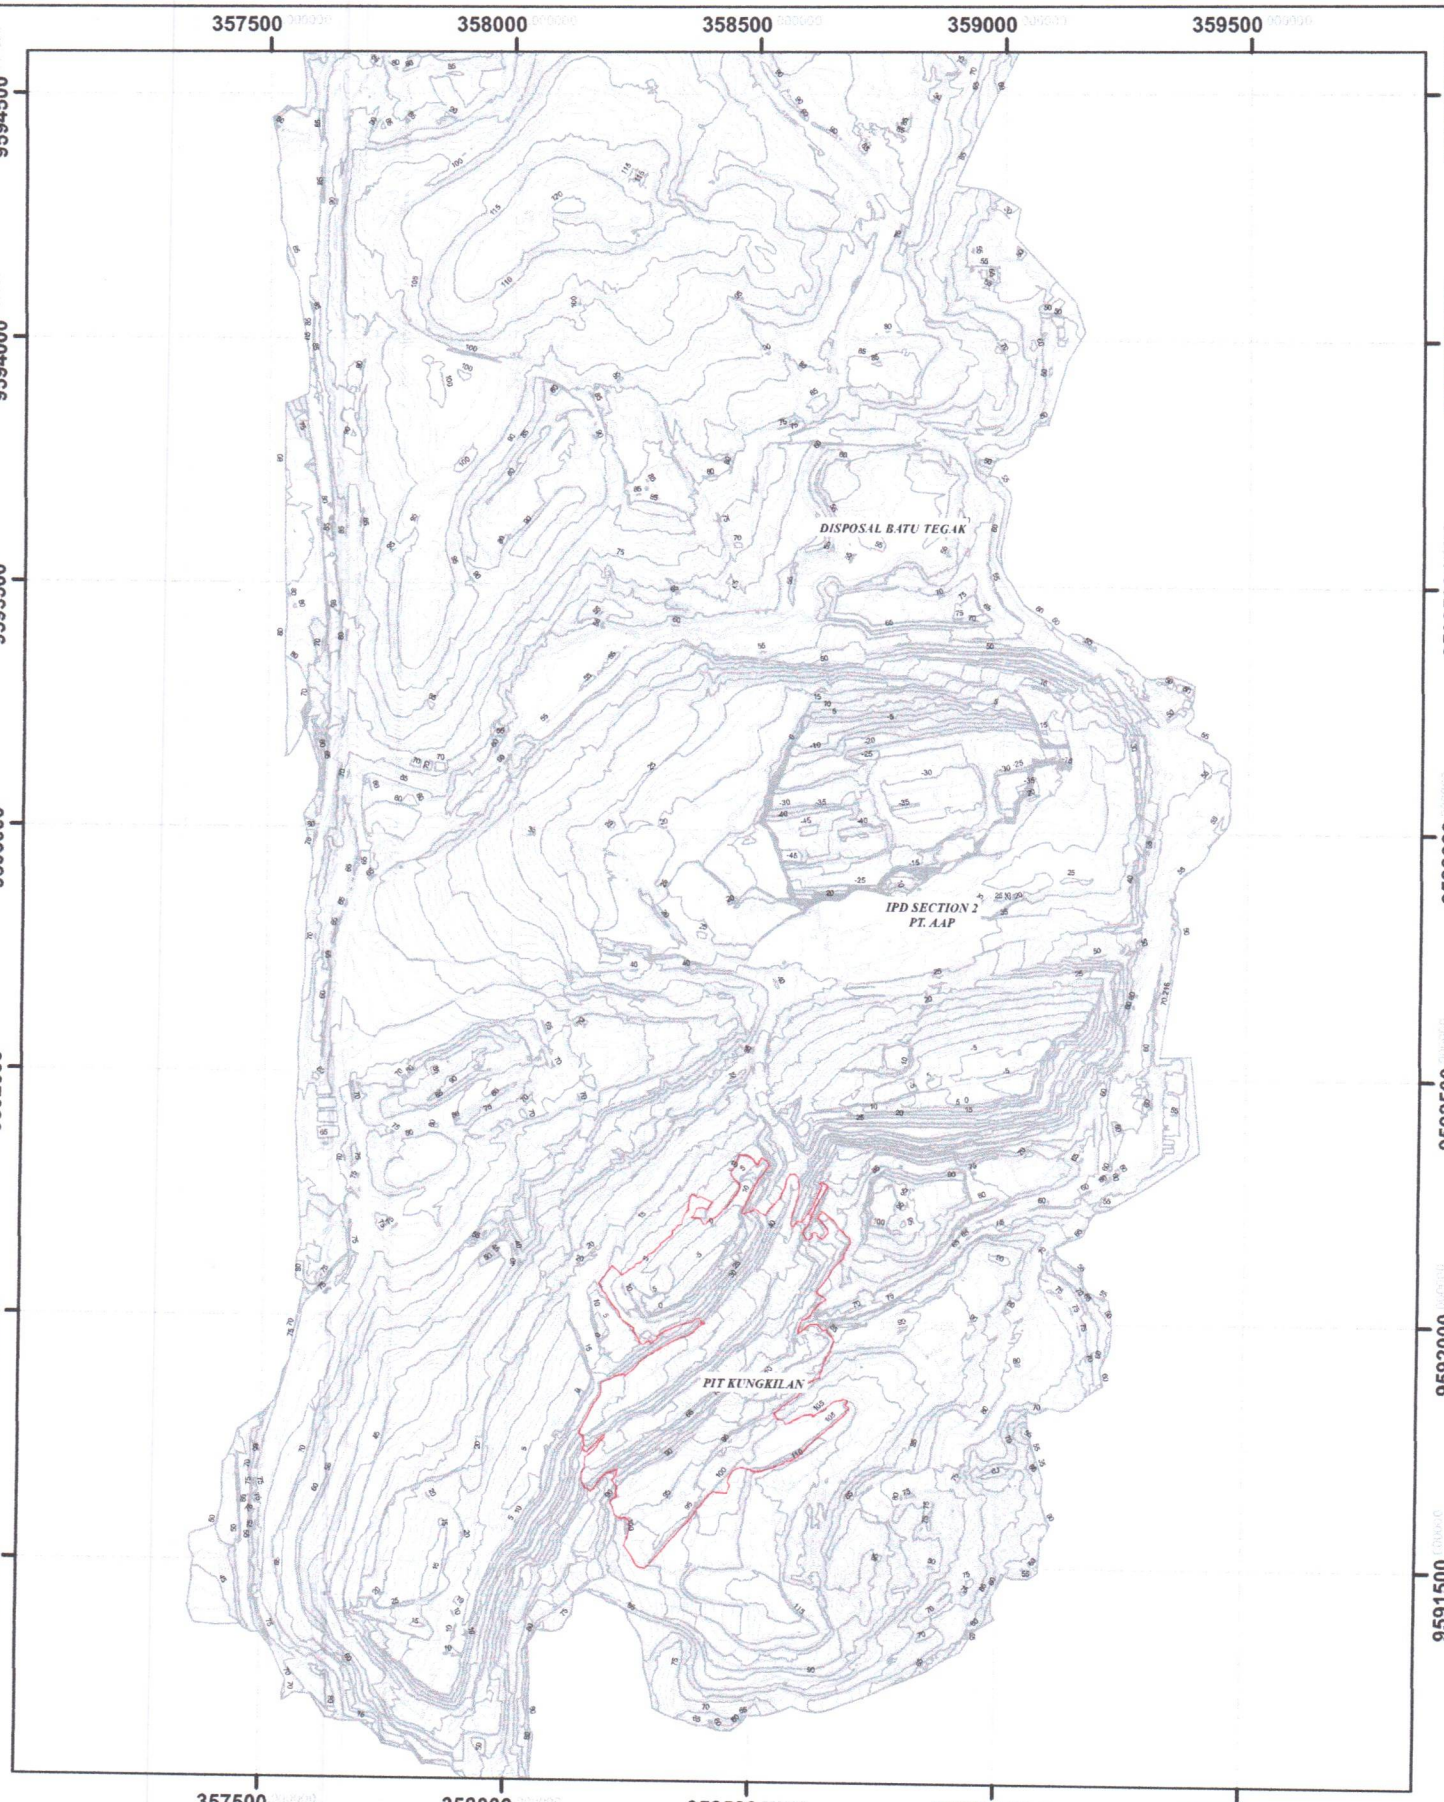

PETA PROGRES
SITUASI TAMBANG
JUNI 2026

N

1:15,000

300 150 0 300 Meters

VOLUME CUT OFF
Pit Kungkilan


OB	210,211.149 Bcm
COAL	46,683.480 Mt
SR	4.50

Catatan:
Jarak Hauling Dari Pit Area - Stockpile : 4,000 - 4,700 meter
Jarak Buang OB Dari Pit Area - Disposal : 100 - 3,400 meter

Legenda :

- Boundary kkl
- Countur Mayor
- Countur Minor

PT. AAP		
Dibuat	Diketahui	Disetujui
PT. BGG		
Dibuat	Diketahui	Disetujui

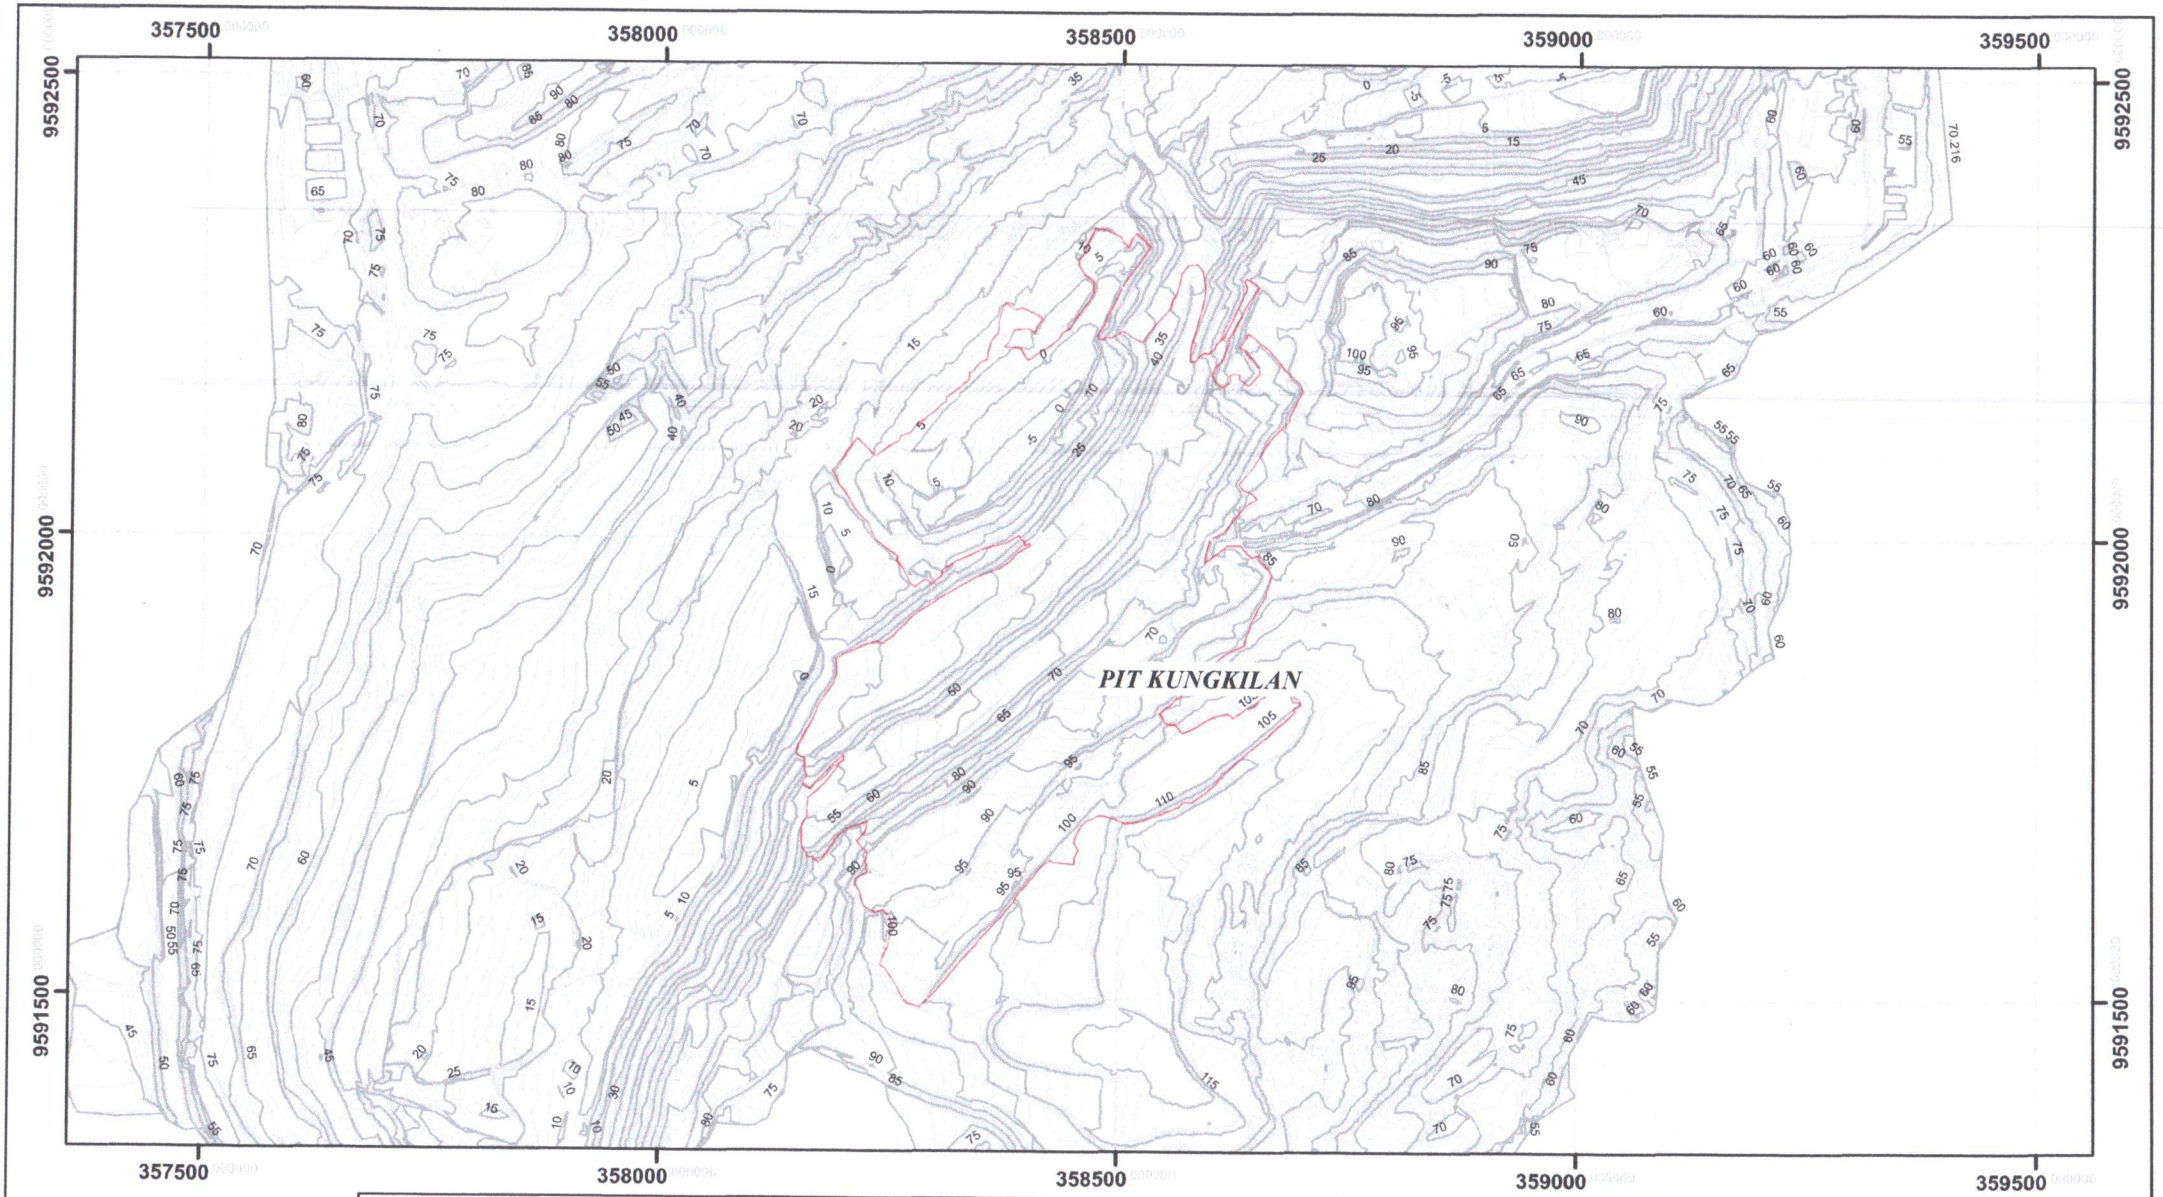

PETA SITUASI
PIT KKL JUNI 2026

N

1:8,000

160 80 0 160 Meters

VOLUME CUT OFF
Pit Kungkilan


OB	210,211.149 Bcm
COAL	46,683.480 Mt
SR	4.50

Catatan :
Jarak Hauling Dari Pit Area - Stockpile : 4,700 - 4,700 meter
Jarak Buang OB Dari Pit Area - Disposal : 100 - 2,400 meter

Legenda :

- Boundary kkl
- Countur Mayor
- Countur Minor

PT. AAP		
Dibuat	Diketahui	Disetujui
PT. BGG		
Dibuat	Diketahui	Disetujui

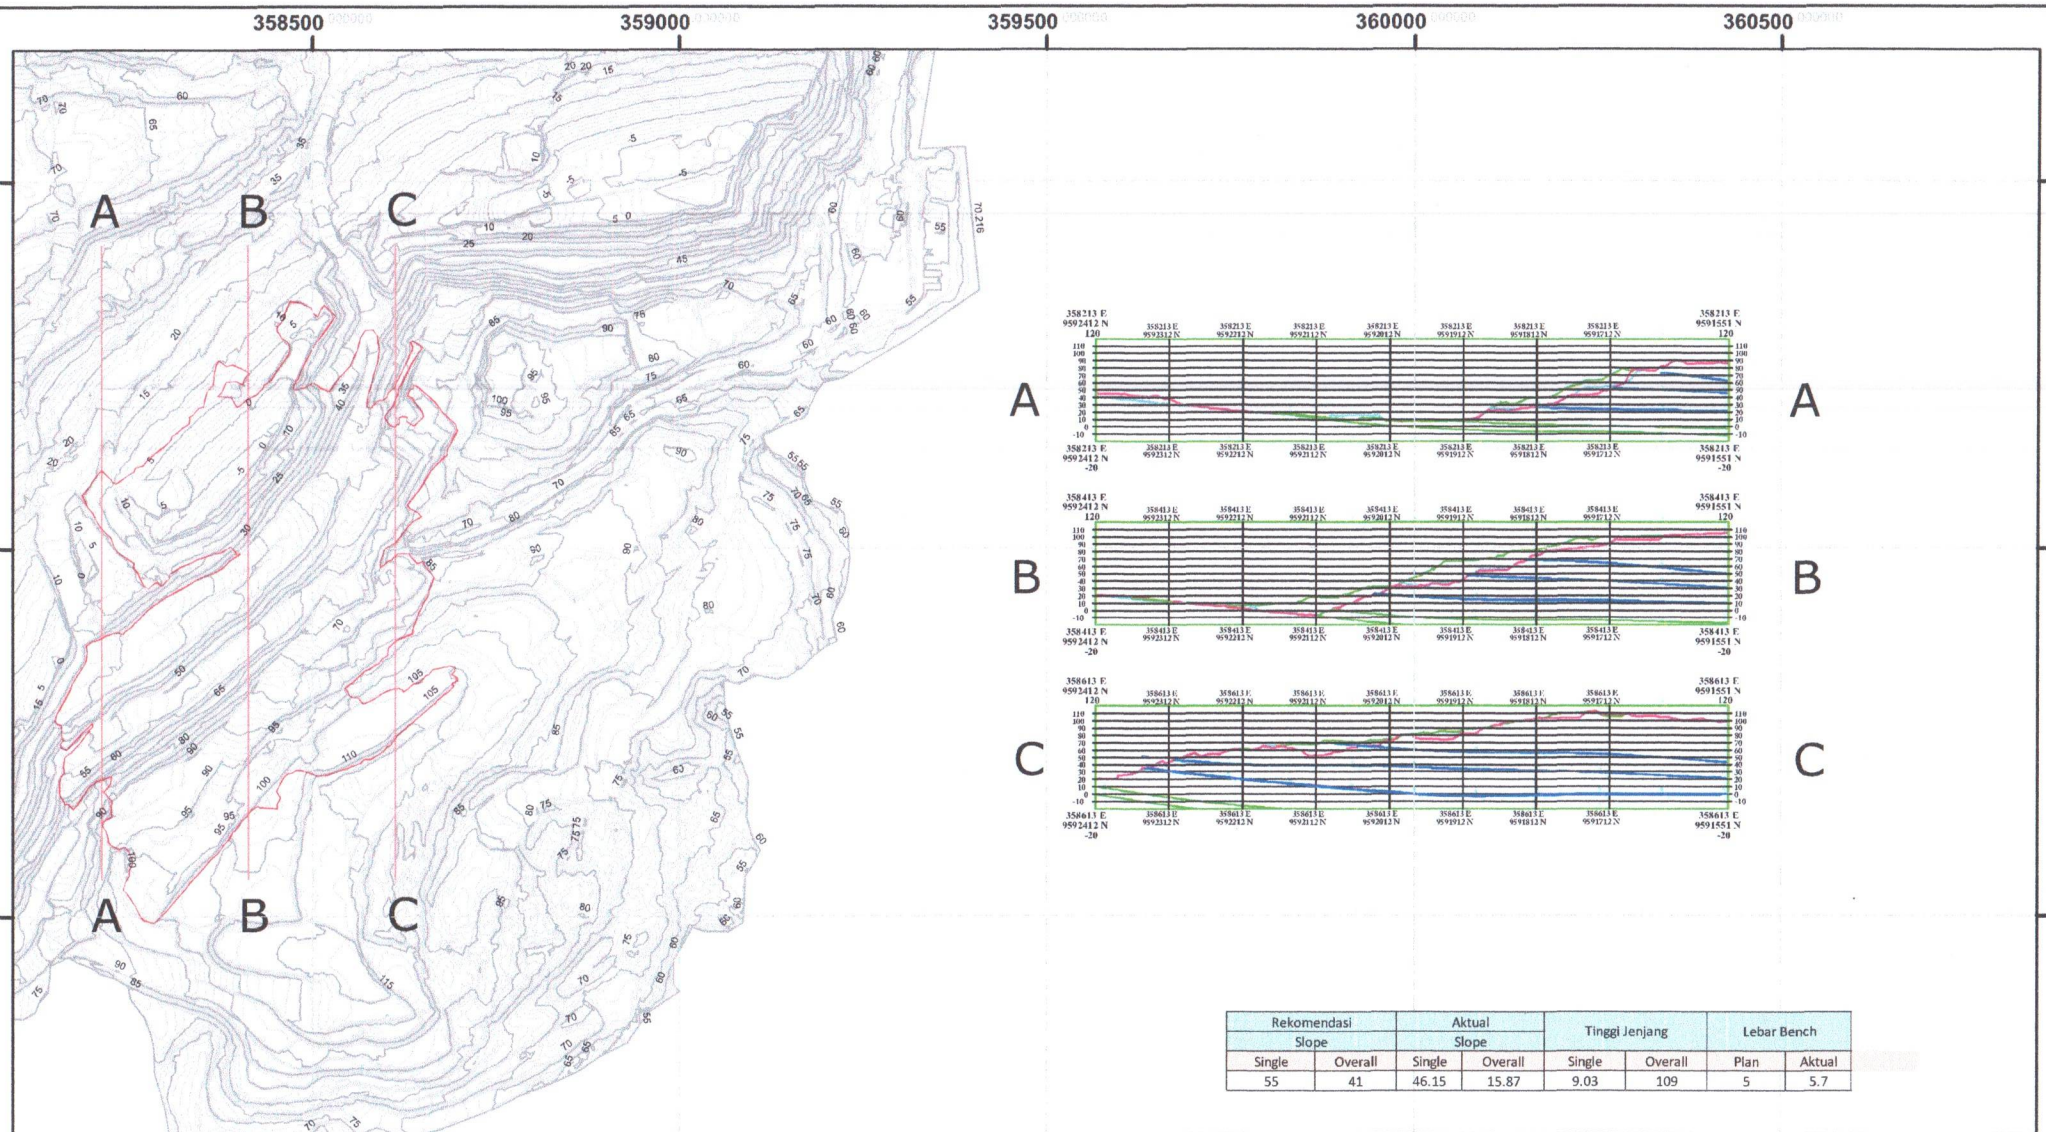

Rekomendasi		Aktual		Tinggi Jenjang		Lebar Bench	
Slope		Slope					
Single	Overall	Single	Overall	Single	Overall	Plan	Aktual
55	41	46.15	15.87	9.03	109	5	5.7

PETA CROSS SECTION
PIT KKL JUNI 2026

N

1:10,000

200 100 0 200 Meters

VOLUME CUT OFF
Pit Kungkilan


OB	210,211.149 Bcm
COAL	46,683.480 Mt
SR	4.50


Catatan :
Jarak Hauling Dari Pit Area - Stockpile : 4.000 - 4.700 meter
Jarak Buang OB Dari Pit Area - Disposal : 100 - 3.400 meter


Legenda :

- Boundary KKL
- Countur Mayor
- Countur Minor

PT. AAP		
Dibuat	Diketahui	Disetujui
PT. BGG		
Dibuat	Diketahui	Disetujui

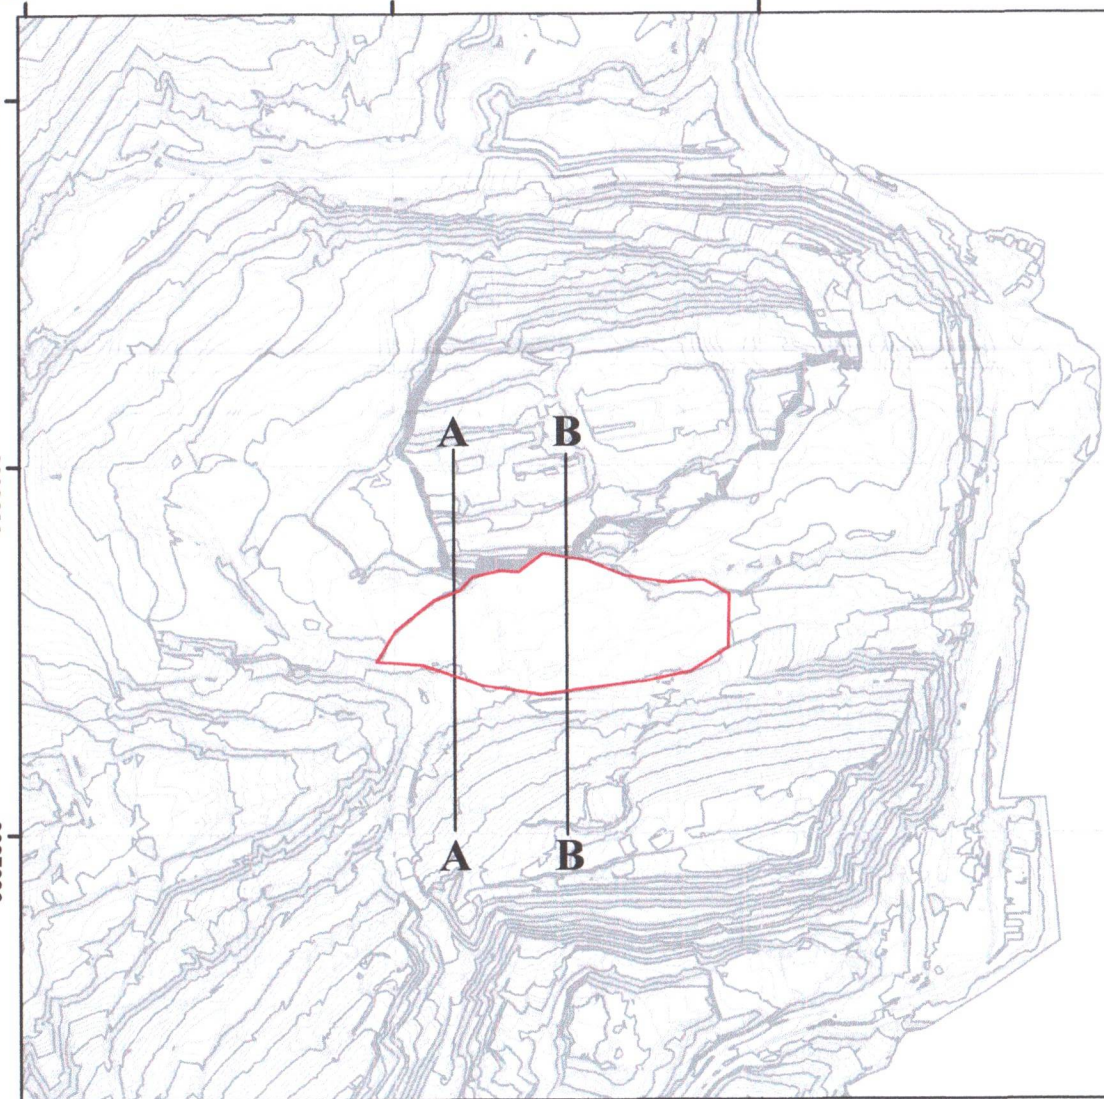





Rekomendasi		Aktual		Tinggi Jenjang		Lebar Bench	
Slope		Slope					
Single	Overall	Single	Overall	Single	Overall	Plan	Aktual
46	28	25.8	0.26	0.56	0.64	5	70

PETA CROSS SECTION
DISPOSAL JUNI 2026

N

1:10,000

200 100 0 200 Meters

VOLUME CUT OFF
Pit Kungkilan

OB	210,211.149 Bcm
COAL	46,683.480 Mt
SR	4.50

Catatan :
Jarak Hauling Dari Pit Area - Stockpile : 4.000 - 4.700 meter
Jarak Hauling OB Dari Pit Area - Disposal : 100 - 3.400 meter

Legenda :

- Boundary Dsp Sect 2
- Countur Mayor
- Countur Minor

PT. AAP		
Dibuat	Diketahui	Disetujui
PT. BGG		
Dibuat	Diketahui	Disetujui
